

6e Rapportage
Comité van Toezicht
Investeringsbudget Landelijk Gebied

Datum: 4 Januari 2013

Voorwoord

De onderhandelingen over het Natuurakkoord tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk hebben op 23 November 2012 geleid tot nieuwe bestuursovereenkomsten gericht op de afwikkeling van het ILG. De afspraken zijn er op gericht om tot afwikkeling van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) te komen over de periode 2007 tot en met 2010. Deze periode zal worden afgesloten met een beoordeling van de bereikte prestaties door het Comité en een afsluitende accountantscontrole van de bestedingen ten laste van de rijksbijdrage.

Deze 6^e rapportage heeft tot doel inzicht te geven in de gerapporteerde prestaties en bestedingen tot en met het jaar 2011. De aanleiding hiervan is de wens van de Tweede Kamer om nader inzicht in de voortgang van het ILG en van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als onderdeel daarvan in verband met vaststelling van de rekening van het voormalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het jaar 2011, waarin de verleende voorschotten over dat jaar voor het ILG zijn verantwoord.

Voormalig staatssecretaris Bleker heeft in Augustus 2012 het Comité verzocht de prestatiebeoordeling voor 1 maart 2013 af te ronden. Het Comité heeft daarmee ingestemd onder vermelding dat deze doelstelling afhankelijk is van de medewerking en de mogelijkheden van de provincies om de benodigde informatie tijdig beschikbaar te stellen. Inmiddels is gebleken dat deze termijn te ambitieus is geweest, mede in verband met de voorbereiding van de nieuwe bestuursovereenkomsten. Het Comité streeft er nu naar de beoordelingswerkzaamheden in het eerste halfjaar van 2013 af te ronden met een eindrapportage.

W. Veldman (voorzitter)

W. van den Arend

H. Mulder

W. Wijntjes

I. Oomes (secretaris)

Inhoud

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding..... | 4 |
| 2. Opvattingen CvT ILG over de prestatie- en bestedingsinformatie tot en met 2011 | 5 |
| 3. De resultaten van het ILG..... | 10 |
| 4. De normkostenproblematiek..... | 12 |
| 5. De prestaties en bestedingen tot en met 2011..... | 14 |
| 5.1 Algemeen ILG..... | 14 |
| 5.2 Prestaties Natuur..... | 15 |
| 5.2.1 Ecologische hoofdstructuur EHS..... | 15 |
| 5.2.2 Natuur buiten de EHS | 19 |
| 5.3 Landbouw | 20 |
| 5.4 Recreatie..... | 21 |
| 5.5 Landschap | 25 |
| 5.6 Bodem..... | 27 |
| 5.7 Water..... | 27 |
| 5.8 Aandachtsgebieden | 28 |
| 5.9 Vitaliteit | 28 |
| 5.10 Samenvatting beheer..... | 29 |
| 6. Betekenis van de uitgevoerde accountantscontrole voor de vaststelling van prestaties en bestedingen | 30 |
| 7. Werkwijze CvT ILG in verband met de prestatievaststelling..... | 31 |
| Annex 1 Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie tot en met 2011..... | 32 |
| Totaaloverzicht | 33 |
| Groningen | 34 |
| Friesland..... | 35 |
| Drenthe..... | 36 |
| Overijssel..... | 37 |
| Gelderland..... | 38 |
| Utrecht..... | 39 |
| Zuid Holland..... | 40 |
| Noord Holland | 41 |
| Limburg..... | 42 |
| Noord Brabant..... | 43 |
| Zeeland | 44 |
| Flevoland | 45 |

1. Inleiding

Op 12 oktober j.l heeft het Comité zijn 5^e rapportage uitgebracht met daarin een risicoanalyse van de huidige situatie van het ILG mede in het licht van het onderhandelingsakkoord (natuurakkoord) tussen het IPO en het Rijk.

Het CvT ILG is inmiddels begonnen met de beoordeling van de prestaties van de afzonderlijke provincies over de periode 2007 tot en met 2010. Over de uitkomsten van dit onderzoek zal pas worden gerapporteerd aan de verantwoordelijke bewindspersoon nadat een volledige hoor- en wederhoor procedure is afgewerkt met de betreffende colleges van Gedeputeerde Staten.

De nu voorliggende 6^e rapportage van het CvT ILG is opgesteld in verband met de afwikkeling van de motie Jacobi c.s. voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 juli 2012¹. Aan het Comité is gevraagd een kritische beoordeling te geven over de informatie die aan de Tweede Kamer in dat verband is verstrekt. Deze informatie heeft betrekking op prestatie- en bestedingsinformatie van EHS en overig ILG over het jaar 2011, de uitkomsten van een door Alterra uitgevoerd onderzoek naar de effectiviteit van het ILG tot dusverre en over de voorstellen voor oplossing van de zogenaamde normkosten problematiek.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de door provincies verstrekte prestatie- en bestedingsgegevens over 2011 mede in verband met de motie Jacobi.

Het commentaar van het CvT op het door Alterra uitgevoerde onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 3. De opmerkingen bij de uitkomsten van het normkostenonderzoek worden behandeld in de hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat een globale beoordeling van de door provincies verstrekte prestatie en bestedingsgegevens over de periode 2007 tot en met 2011. In Annex 1 zijn de overzichten van het ILG zowel in totaal als per provincie over de periode 2007 - 2011 opgenomen².

Hoofdstuk 6 gaat over de door provincieaccountants en de accountants van het ministerie van EL&I (sinds mei 2012 Audit Dienst Rijk) uitgevoerde controles en de afgegeven controleverklaringen voor de beoordeling van prestaties en van de gerapporteerde bestedingen ten laste van de rijksbijdragen.

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de voorgenomen werkwijze van het CvT ILG voor de vaststelling van de provinciale prestaties per operationeel doel van het ILG.

¹ Kamerstuk 33 240 nr. 17

² In de 4^e rapportage van het CvT ILG zijn de overeenkomstige gegevens opgenomen over de periode 2007 tot en met 2010.

2. Opvattingen CvT ILG over de prestatie- en bestedingsinformatie tot en met 2011

In de motie Jacobi is gevraagd in November 2012 een volledige en adequate rapportage op te stellen van het ILG over de periode 2007 tot en met 2011 en inzicht te geven in de verplichtingenstand. De rapportage zou een analyse moeten bevatten van de gerealiseerde ILG prestaties en bestedingen en inzicht moeten geven in de betekenis van de investering voor de beoogde natuurdoelen. Tevens zou inzicht moeten worden gegeven in de verscheidenheid in grondprijzen.

Beschikbare informatie over prestaties en bestedingen

In Annex 1. bij deze rapportage is een overzicht opgenomen van prestaties en bestedingen zowel in totaal als per provincie over de periode 2007 tot en met 2011, uitgesplitst per operationeel doel. Dit betreft de informatie uit de voortgangsrapportages van de provincies tot en met 2010, aangevuld met de aan het Comité verstrekte gegevens over 2011.

Bij de opgave door de provincies van de bestedingsgegevens over 2011 is in afwijking van voorgaande jaren geen gebruik gemaakt van gewaarmerkte overzichten, omdat de controleverklaringen van de provinciale accountants over 2011 niet beschikbaar zijn gesteld. Deze afwijking in procedure voor 2011 is een gevolg van de gemaakte afspraken in het Natuurakkoord.

Het Comité is van mening dat de overzichten in Annex 1 bij dit rapport betekenisvolle informatie geven. Er wordt een globaal beeld zichtbaar zowel voor het hele land als voor de afzonderlijke provincies. In zijn eerdere rapportages heeft het Comité herhaaldelijk aangegeven dat de verstrekte informatie in de jaarlijkse voortgangsrapportages (het zogenaamde PEIL) belangrijke tekortkomingen heeft. Voor een oriëntatie op beleidsdoeleinden kan deze informatie van nut zijn, echter zonder nader onderzoek acht het Comité het niet verantwoord op deze basis tot afrekening en afwikkeling te komen.

De nu bekende tekortkomingen in de overzichten, zoals opgenomen in Annex 1 kunnen als volgt worden toegelicht.

De prestaties voor verwerving (Ecologische Hoofdstructuur en Recreatie om de Stad) zijn gebaseerd op achtereenvolgende metingen per 1 januari 2007 en per 1 januari 2011. De in deze zogenaamde nulmetingen op kaart (NOK) opgenomen waarden betreffen zowel feitelijke aankopen als meetverschillen en mogelijk andere correcties.

Meer algemeen wordt opgemerkt dat de informatie uit de natuurmetingen op kaart (NOK) niet als verantwoordingsinformatie kan worden opgevat. Doel van het NOK is de gebiedsontwikkeling middels kaartgegevens zichtbaar te maken. Daarbij is het niet noodzakelijk dat de kaartgegevens aansluiten op de onderliggende registraties. Deze verschillen, de oorzaken en de betekenis daarvan zullen door het CvT ILG nader worden onderzocht en na afronding van het onderzoek bij de provincies worden gerapporteerd. Zoals hiervoor vermeld is het CvT ILG van mening dat de NOK gegevens relevant zijn voor de verdere beleidsvorming. De aansluiting op de onderliggende registraties zal te zijner tijd worden gebruikt voor de afwikkeling van de rijksbijdrage.

Het Comité gaat er van uit dat de opgegeven financiële bestedingen zijn gebaseerd op werkelijke uitgaven voor de verwerving van natuur- en recreatiegronden. Het Comité beschikt voor elke provincie over alle uitgevoerde grondtransacties via het Bureau Beheer landbouwgronden (BBL) over de periode 2007 tot en met 2011. De transacties die niet via BBL zijn verlopen (beperkt in aantal) zullen nog door de provincies aan het Comité ter beschikking worden gesteld. In de rapportages per provincie zal worden aangegeven wat de feitelijke verwerving is geweest en welke bestedingen daar bij behoren. Tevens zal kunnen worden aangegeven wat in de 'oude' systematiek van het ILG nog de resterende taakstelling inzake grondverwerving is van een provincie per 1 januari 2011 en per 1 januari 2012.

De prestaties voor inrichting (EHS, Landbouw, Recreatie, Landschap), zoals vermeld in de voortgangsrapportages zijn niet eenvoudig vast te stellen. In het kader van het onderzoek bij de provincies zal duidelijk moeten worden welke betekenis kan worden gehecht aan de voor inrichting in de voortgangsrapportages vermelde hectaregegevens, omdat deze per project zijn vastgesteld en niet kan worden teruggevallen op één gegevensbron. Het Comité heeft de beschikking over de bestedingen, voor zover deze zijn gedaan door de Dienst landelijk Gebied (DLG) over de periode 2007 tot en met 2011. Deze informatie laat zien voor welke (deel) fase en afzonderlijk project in een gebiedsontwikkeling gelden zijn toegezegd, jaarlijks zijn besteed in 2007 tot en met 2011 en welke geldelijke ontvangsten er zijn geweest. Ook is daarin direct afleesbaar in hoeverre bestedingen betrekking hebben op door het rijk per 1 januari 2007 aan de provincies overgedragen lopende verplichtingen (oude toezeggingen) en de daarna door provincie toegezegde bedragen voor gebiedsontwikkeling. Deze informatie sluit echter nog niet aan bij de voortgangsrapportages van de provincies.

De vraag in de motie Jacobi naar de verplichtingenstand is in deze fase in zoverre te beantwoorden dat een maximumstand kan worden vastgesteld. Deze stand is het verschil tussen de bij beschikkingen toegezegde (oude en nieuwe) middelen voor afzonderlijke projecten, verminderd met de betaalde bedragen en vermeerderd met ontvangsten. Vele projecten zijn echter geëindigd of worden niet voortgezet zonder dat de niet meer noodzakelijke middelen zijn vrijgemaakt. Het Comité zal bij het onderzoek van de prestaties aan de provincies vragen voldoende inzicht te geven en na onderzoek hierover rapporteren.

Met betrekking tot beheer verwacht het Comité dat de in de voortgangsrapportages opgegeven prestaties en bestedingen voldoende betrouwbaar zullen blijken, mede gezien de strikte controle-eisen rond de uitvoering van beheersregelingen. De Dienst regelingen (DR) heeft aan het Comité nauwkeurige informatie verschaft over de periode 2007 tot en met 2011, waaruit landelijk en per provincie de verleende en uitbetaalde subsidies per beheersregeling zijn af te lezen.

Voor de overige ILG doelen kunnen dezelfde opmerkingen worden gemaakt als hiervoor opgenomen voor inrichting.

Samenvattend is het CvT van oordeel dat de in Annex 1 opgenomen gegevens in deze fase van afwikkeling het best beschikbare kwantitatieve beeld geven van de inzet van de rijksbijdrage in het ILG.

Aan de provincies verleende voorschotten ILG en uitputting van het Groenfonds

De provinciale rekeningen van het Groenfonds kunnen worden beschouwd als normale bankrekeningen, echter uitsluitend bedoeld voor de financiering van ILG bestedingen.

Uit de jaarverslagen van het Groenfonds over de periode 2007 tot en met 2011 zijn de volgende gegevens in verband met de storting en opnames van de rijksbijdrage af te leiden voor alle provincies gezamenlijk.

| Totaal | Saldo | Voorschot | Opnamen | Stortingen | Rente | Totaal |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Jaar | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | | x € 1.000 | x € 1.000 |
| 2007 | 0 | 439.201 | -263.685 | 10.720 | 9.344 | 195.580 |
| 2008 | 195.580 | 498.177 | -421.477 | 1.714 | 11.992 | 285.985 |
| 2009 | 285.985 | 427.940 | -470.349 | 0 | 6.400 | 249.976 |
| 2010 | 249.976 | 472.264 | -483.274 | 0 | 1.572 | 240.538 |
| T/m 2010 | | 1.837.582 | -1.638.785 | 12.434 | 29.308 | |
| 2011 | 240.538 | 643.574 | -485.204 | | 2.800 | 401.708 |
| T/m 2011 | | 2.481.156 | -2.123.989 | 12.434 | 32.108 | |

Hieruit kan worden afgeleid dat tot en met 2011 € 2,48 miljard is gestort en dat de provincies 2,12 miljard hebben opgenomen. Rekening houdend met stortingen door provincies en ontvangen rente staat per 1 januari 2012 nog € 401 miljoen als niet opgenomen. Dit overzicht geeft aan dat in 2011 het hoogste voorschot is uitbetaald over de gehele ILG periode (conform afgesproken kasritme), dat tevens de hoogste opname door provincies is geweest en dat het openstaande saldo nog niet zo hoog is geweest.

Afwikkeling rijksbijdrage

In het kader van de afrekening van de rijksbijdrage tussen rijk en provincies zal per provincie een vaststelling moeten worden gemaakt van het verschil tussen ontvangen voorschotten en de vast te stellen rijksbijdrage. Op basis van de voorschotverrekening en de gebruiksregels van het Groenfonds zullen te zijner tijd deze rekeningen moeten worden vereffend.

Op 23 november 2012 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken met de afzonderlijke colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies een overeenkomst gesloten gericht op het per 14 december 2011 laten vervallen van de bestuursovereenkomsten ILG 2007 – 2013. De afrondingsovereenkomsten regelen dat de provincies aanspraak maken op een budget dat conform het Natuurakkoord wordt bepaald op basis van de in de periode van 1 januari 2007 tot en 1 januari 2011 door de provincie daadwerkelijk geleverde prestaties tegen een reëel normkostenniveau. Daarbij wordt uitgegaan van de werkelijke bestedingen door de provincie van de middelen van het oorspronkelijk verleende investeringsbudget tot 1 januari 2011 ten behoeve van de in de bestuursovereenkomst ILG 2007–2013 overeengekomen doelen en prestaties, op basis van gewaarmerkte accountantscontroles en een beoordeling van de prestaties door het Comité van Toezicht.

Verder is in de afrondingsovereenkomsten vastgelegd is dat een definitieve afwikkeling van de rijksbijdrage pas kan plaatsvinden als de WILG in overeenstemming met het Akkoord is gewijzigd

en dat de voorgenomen afwikkeling, inclusief FES- projecten en de verstrekte voorschotten, dient plaats te vinden met inachtneming van de WILG zoals deze thans luidt.

De afrondingsovereenkomsten geven de volgende uitgangspunten voor de afwikkeling van het ILG tot en met 2010:

- het door een accountant gewaarmerkte PEIL- overzicht 2010;
- verklaring met betrekking tot de jaren 2007 tot en met 2010 van de Dienst Regelingen over de bestedingen van de provincies ten laste van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);
- verklaring van de Stichting Groenfonds over de bestedingen van de provincie ten laste van de leenfaciliteit en ten laste van de garantieregeling voor grondverwerving;
- verklaring van het Bureau Beheer Landbouwgronden over de inzet ten behoeve van de middelen voortkomend uit de exploitatiewinst als gevolg van grondtransacties.

De 12 nieuwe overeenkomsten vervangen de bestuursovereenkomsten ILG 2007 -2013, gesloten op 18 December 2006 en laatstelijk gewijzigd op 16 December 2010.

Voor alle provincies is een aanspraak (op de rijksbijdrage) vastgesteld voor de perioden:

- a. 1 januari 2007 tot en met 31 December 2010;
- b. 1 januari 2011 tot en met 31 December 2013.

De aanspraak sub a. is bedoeld als afrekening van de gerealiseerde bestedingen tot en met 2010, overeenkomstig het Akkoord. Het tweede deel sub b. dient ter financiering van het beheer en van de harde juridische verplichtingen die zijn aangegaan voor 20 Oktober 2010 met het oog op de in het Akkoord genoemde doelstellingen. De verdeling van de aanspraken is gebaseerd op een door de provincies gezamenlijk bepaalde onderlinge verdeling. De middelen over 2011 tot en met 2013 worden verstrekt als specifieke uitkering of als decentralisatie-uitkering op basis van de Financiële verhoudingswet. De verdeling tussen de provincies kan tot uiterlijk op 15 april 2013 worden gewijzigd indien de kosten van beheer over de periode 2010 tot en met 2013 daartoe aanleiding geven.

De financiële afwikkeling van de aanspraak gebeurt onder aftrek van verleende voorschotten. Daarbij wordt er van uitgegaan dat het rijk de in de ILG beschikking vermelde afdrachten aan het BTW - compensatiefonds heeft afgewikkeld (dit houdt in dat er van wordt uitgegaan dat de PEIL bestedingen voor zover van toepassing eveneens exclusief BTW zijn gerapporteerd).

De afspraken over de beschikbaarstelling van de capaciteit van de Dienst Regelingen (DR) en de Dienst Landelijk gebied (DLG) zijn beperkt tot en met het jaar 2014.

De overeenkomsten bevatten een afspraak over de rechtmatigheidstoets van besteding van middelen. Daarin wordt aangesloten op artikel 10 tweede lid, onderdeel a en d van de huidige WILG, waarin is opgenomen dat middelen dienen te worden besteed aan de vermelde doelen in de beschikking. Bestedingen die niet aan deze eis voldoen zullen bij de betreffende provincie worden gecorrigeerd en komen volgens de door de provincies gezamenlijk bepaalde verdeelsleutel ten goede aan alle provincies.

Met betrekking tot de status van de beoordeling door het Comité van Toezicht is in de afrondingsovereenkomsten vastgesteld dat deze is gebaseerd op hoofdstuk 4a van de Regeling

inrichting landelijk gebied. Conform het Akkoord zal het CvT de prestaties per provincie beoordelen die door de provincies zijn geleverd voor het overeengekomen bedrag van € 2.014.194.000 aan bestedingen over de periode 2007 – 2010. In de afrondingsovereenkomsten wordt als meerwaarde gezien dat deze beoordeling zicht biedt op de tot nu toe geleverde prestaties door de provincies en dat zij de verschillen verklaart tussen de ILG-cijfers, gebaseerd op de gewaarmerkte PEIL-rapportages en de cijfers van de provincies die vaak gebaseerd zijn op meer bronnen. Aangegeven is dat de rapportage en de bevindingen van het CvT geen deel uitmaken van de overeenkomst en de uitkomsten van de prestatiebeoordeling daarmee geen invloed kunnen hebben op het totaal aan beschikbare middelen voor de afronding van het ILG.

Voor de prestatiebeoordeling door het CvT is het in verband met de daarmee samenhangende bestedingen van belang dat beschikt kan worden over de uitkomsten van de accountantscontroles per provincie over de periode 2007 tot en met 2010. In hoofdstuk 6 van dit rapport wordt nader ingegaan op de betekenis van de accountantscontrole, zowel voor de prestatiebeoordeling als voor de afwikkeling van de rijksbijdrage in het ILG.

Het Comité is van mening dat op dit moment onvoldoende basis aanwezig is voor het gewenste inzicht in de aanwending van de ILG gelden tot en met 2011. Volledige duidelijkheid is pas mogelijk na uitvoering van de prestatiebeoordeling door het Comité en de (nog) uit te voeren werkzaamheden in het kader van de accountantscontrole.

3. De resultaten van het ILG

Op verzoek van het ministerie van EL&I is door Alterra onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bereikte resultaten van het ILG en het opsporen van 'lessons learned'.

Het CvT heeft kennisgenomen van de uitkomsten van dit onderzoek³. De rapportage geeft naar de mening van het CvT een goed inzicht in de ontwikkeling van het ILG als geheel. Het Comité heeft er begrip voor dat in de korte periode waarin de onderzoekers hun onderzoek hebben uitgevoerd zij zich grotendeels hebben moeten beperken tot hoofdlijnen en meer algemene ontwikkelingen. De ontwikkelingen in de ILG (natuur- en andere) doelen hebben naar de mening van het CvT door omvang en veelsoortigheid tot dusverre te weinig individuele aandacht gehad. Het is daarom plezierig dat in deze rapportage een aantal concrete ontwikkelingen zijn neergezet.

Het ILG en de in dat verband afgesloten bestuursovereenkomsten betreffen twee partijen die gezamenlijk doelen hebben gesteld. De uitgangspunten in de huidige Wet Inrichting landelijk Gebied (WILG) zijn dat de provincies het ILG uitvoeren en dat het rijk op afgesproken punten belangrijke condities invult. Bij de start van het ILG in 2007 is mogelijk onderschat dat zeker een aantal provincies een lange aanloop nodig hebben gehad, omdat geen of weinig ervaring bestond met de sturing van de uitvoering. Nagenoeg alle provincies hebben op dit punt een flinke omslag moeten maken en dat heeft een flitsende start van het ILG in de weg gezeten. Het rijk heeft zich vanaf het najaar 2010 meer geconcentreerd op de realisatie van de bezuiniging op het ILG.

Bij de aanvang van het ILG was de verwachting dat het rijk ca 2/3 van de middelen zou verstrekken en dat de provincies zich zullen inspannen om ook een derde deel bij te dragen met eigen middelen en met andere partijen. Hierin zijn de provincies, mede gezien de beperkte periode, nog niet zichtbaar geslaagd.

De gedachte achter de bestuursovereenkomsten is geweest dat overheden elkaar moeten kunnen aanspreken op prestaties. Tot eind 2010 is naar dit principe gehandeld en zijn via de zogenaamde PEIL-formats relevante beleidsprestaties gerapporteerd. In het kader van de Mid Term Review in de zomer van 2010 is daarnaast belangrijke beleidsinhoudelijke informatie ook op gebiedsniveau door de provincies verstrekt. Het CvT is daarom van mening dat wel degelijk beleidsprestaties zijn bijgehouden en de feitelijke gebiedsontwikkelingen fysiek kunnen worden aanschouwd.

Een belangrijk punt in de gebiedsgerichte ontwikkeling is het kunnen beschikken over relevante en voldoende betrouwbare informatie. Het CvT ILG heeft in voorgaande rapportages gepleit voor de instelling van een gegevensautoriteit. De huidige informatievoorziening voor beleidsdoeleinden is gebaseerd op kaartmateriaal, omdat alleen daarmee beeldvorming mogelijk over een gebiedsontwikkeling. Gebleken is echter dat de aansluiting tussen NOK, de facto alleen kaartgegevens, en formele registraties van grond en bestemming, problematisch is gebleken. Bij de voorliggende rapportages wordt dit zichtbaar doordat de gegevens uit de Nulmeting op kaart en de door de provincies in het kader van het ILG opgegeven prestaties (PEIL) niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Het CvT heeft in deze fase van onderzoek wel kunnen

³ Alterra Wageningen UR, rapport nummer 2371 2012

vaststellen dat de PEIL gegevens in belangrijke mate herleidbaar zijn op onderliggende registraties in het bijzonder van DLG en DR.

4. De normkostenproblematiek

Het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en Alterra (Universiteit Wageningen) heeft een onderzoek gedaan naar methoden, kosten en prestaties in het ILG-kader voor verwerving en inrichting van EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en RodS (Recreatie om de Stad). Daaruit komt naar voren dat de DLG administraties een goede bron van informatie bieden over de periode 2007 tot en met 2010.

Verwerving EHS en RodS

Over de gerealiseerde grondprijzen is gesteld dat deze gemiddeld vrijwel marktconform zijn geweest.

Alterra heeft een analyse uitgevoerd per provincie op de aankoop van akkerbouw- en grasland waaruit blijkt dat afwijkingen sterk regionaal gebonden zijn. In totaal is ca. 11.229 hectare voor de EHS in beschouwing betrokken. In totaal is echter ruim 19.000 hectare EHS verworven (inclusief ruilgronden en natuurterreinen).

De door Alterra onderzochte aankopen zijn door DLG (Dienst Landelijk Gebied) gerealiseerd in opdracht van de provincies waarbij vaste procedures zijn gevolgd. Het CvT merkt op dat het onderzoek geen betrekking heeft gehad op de verkopen van gronden door DLG in opdracht van de provincies en de door provincies buiten DLG om aangekochte en verkochte gronden. Ook is geen nader onderzoek gedaan naar de verworven gronden anders dan akkerbouw- en grasland. Deze aankopen, de verkopen en de aan- en verkopen van gronden buiten DLG om zullen in een later stadium door het CvT ILG worden beoordeeld.

Zoals de onderzoekers melden, is het onderzoek in relatief korte tijd uitgevoerd. Dit korte tijdsbestek heeft invloed gehad op de gekozen informatiebronnen en op de onderzoeksmethode.

Het CvT heeft ook een analyse gemaakt van de (gewogen) gemiddelde aankooprijzen per gebied, in totaal en per jaar voor iedere provincie. De bron, die wij hebben gebruikt, zijn de aankopen 2007 tot en met 2010, die bij DLG/BBL zijn vastgelegd. Bij onze analyse zijn alle aankopen betrokken, ook eventuele aankopen van grond met bijbehorende opstallen. De (gewogen) gemiddelde aankooprijzen zijn vergeleken met de normprijzen zoals aangegeven in de Bestuursovereenkomsten van December 2007 en met de prijzen in de jaarlijkse grondmonitor per provincie. Uit onze analyse blijken afwijkingen ten opzichte van de normprijzen en ten opzichte van de grondmonitor (marktconforme) prijzen waarbij dit per provincie en per jaar sterk van elkaar verschilt. Het CvT zal hier verder nog nader onderzoek naar doen.

De relatie tussen de gerapporteerde hectares en bestedingen is in de voortgangsrapportages niet altijd direct te leggen. Prestaties zijn zowel met besteding van rijksgeld als met provinciale en andere gelden gerealiseerd.

Inrichting EHS en RodS

Met betrekking tot de inrichting EHS is door Alterra onderzoek gedaan naar de na 1 januari 2007 (begin ILG) gestarte projecten, die intussen zijn gereedgekomen. Daarbij gaat het om 1.917 hectare (van in totaal ca. 18.930 hectare volgens de voortgangsrapportages over de periode 2007 tot en met 2011). Het merendeel van de gebiedsinrichting heeft, zoals ook Alterra vermeld, betrekking op projecten die voor en na 1 januari 2007 zijn gestart maar nog niet zijn afgerond.

Over de onderzochte projecten is gemeld dat deze gemiddeld ten opzichte van de in de bestuursovereenkomsten afgesproken normkosten ca. twee maal zo hoog zijn geweest.

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het niet mogelijk is te komen tot reële normkosten, zoals in het natuurakkoord is afgesproken.

Het CvT merkt op dat het merendeel van de inrichtingsprojecten is gestart voor 1 januari 2007 en nog onderhanden zijn of zijn afgerond in de ILG periode. Deze zijn dus niet meegenomen in het onderzoek van Alterra. Voor de inrichtingsprojecten is het lastig om tot reële normkosten te komen, aangezien de hectares niet zijn vastgelegd in hetzelfde systeem waar de uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op het ILG zijn geadministreerd. De hectares zijn op kaartmateriaal wellicht beschikbaar, maar het is niet altijd duidelijk welke hectares met ILG middelen zijn gefinancierd.

Samenvattend

Het kwantitatieve onderzoek van LEI/Alterra geeft noch voor verwerving noch voor inrichting voldoende houvast om de oorspronkelijk in de Bestuursovereenkomsten afgesproken normkosten te vervangen door reële normkosten. Voor een belangrijk aantal onderdelen (verwerving en beheer) zullen veelal de ten behoeve van de ILG doelen gerealiseerde hectares een basis kunnen vormen. Voor deze onderdelen zijn zowel de oorspronkelijke normkosten als de werkelijke uitgaven beschikbaar.

Voor een aantal andere onderdelen waaronder inrichting zal de kwantitatieve prestatie minder goed of niet zijn vast te stellen. In die gevallen zal nader worden onderzocht of de opgegeven bestedingen betrekking hebben op ILG doelen en projecten.


5. De prestaties en bestedingen tot en met 2011

5.1 Algemeen ILG

Het ILG kader is vastgelegd in de zogenaamde overzichtconstructie ILG⁴. Daarin zijn vanaf 2007 begrotingsbedragen samengevoegd van verschillende beleidsartikelen van meerdere ministeries. Het ILG kader vormt de basis voor de aan de afzonderlijke provincies afgegeven beschikkingen ILG en de bevoorschotting aan de provincies.

| ILG kader | X € 1.000 |
|------------------------------------------------|------------------|
| Totaal rijksinzet | 4.151.419 |
| PNB, BBL, POP ⁵ | -432.699 |
| Totaalbestuursovereenkomsten | 3.718.720 |
| Diverse bekende verschillen | - 24.208 |
| Bruto rijksbijdrage volgens beschikking | 3.694.512 |
| Btw compensatie fonds ⁶ | 117.401 |
| Netto rijksbijdrage volgens beschikking | 3.577.111 |

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de door provincies gezamenlijk gerapporteerde cumulatieve bestedingen (exclusief PNB en POP) per jaar over de periode 2007 tot en met 2011 ten opzichte van het beschikbare budget, alsmede de cumulatieve via het Groenfonds uitbetaalde voorschotten.

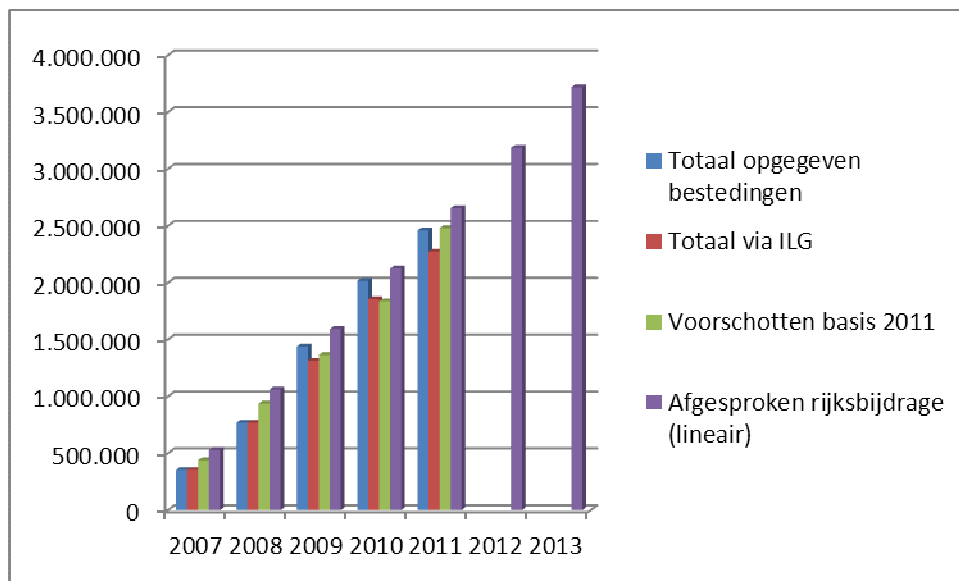

Grafiek 5.1

Het verschil tussen de 'totaal opgegeven bestedingen' en 'totaal ILG' betreft de uitgaven in het kader van de PNB regeling'.

⁴ Zie kamerstuk 33240 XII 19, dd 29 juni 2012

⁵ PNB zijn leningen en garantiestellingen Particulier Natuurbeheer, die buiten het ILG zijn gefinancierd. BBL betreft het aandeel ten behoeve van het ILG in de exploitatieresultaten van het Bureau Beheer Landbouwgronden. POP betreft de bijdragen uit het Europees Landbouwfonds Fonds voor Plattelandsontwikkeling (EFLPO).

⁶ Betreft de afdracht van het ministerie aan het BTW-Compensatiefonds; de provincies kunnen omzetbelasting in hun bestedingen terugvragen bij het Fonds.

De voorschotten tot en met 2011 zijn daadwerkelijk uitbetaald. Geconstateerd kan worden dat het uitgavenpatroon niet zichtbaar heeft geleden onder de voorgenomen bezuiniging.

In de volgende paragrafen worden de prestaties en bestedingen besproken per operationeel doel.

5.2 Prestaties Natuur

5.2.1 Ecologische hoofdstructuur EHS


De ontwikkeling van de EHS bestaat globaal uit de onderdelen verwerving, inrichting, beheer, veenweidegebieden, ecologische verbindingzones en knelpunten. Onderstaand wordt het overzicht gegeven van de prestaties en bestedingen over de periode 2007 tot en met 2011, zoals deze door de provincies zijn opgegeven.

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------|------|------------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | % | BO | Realisatie T/m 2011 | % |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1. Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 20.734 | 17.103 | 82% | 599.836 | 775.665 | 129% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 7.195 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 2.330 | | 0 | 4.230 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 17.546 | 3.071 | 18% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 7.495 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 65.781 | 18.758 | 29% | 468.230 | 183.830 | 39% |
| Beheer | HA | 328.721 | 301.380 | 92% | 942.452 | 538.532 | 57% |
| Veenweidegebied | HA | 51.000 | 88.010 | 173% | 7.960 | 4.068 | 51% |
| EVZ's | HA | 1.027 | 52 | 5% | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 36 | 6 | 17% | 105.300 | 17.679 | 17% |
| Totaal Euro | € | | | | 2.123.778 | 1.524.004 | 72% |

Tabel 5.1

Verwerving

In de onderstaande grafiek worden de cumulatieve prestaties verwerving aangegeven.

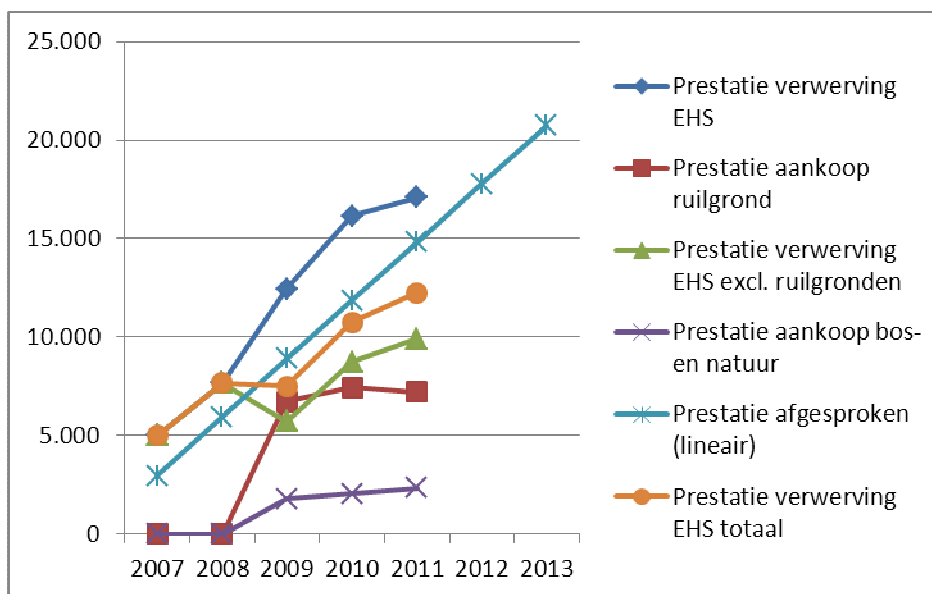


Grafiek 5.2

De 'prestatie verwerving EHS' totaal van ruim 19.000 ha is inclusief ruilgronden en natuur- en bosterreinen. De ruilgronden dienen om op een later tijdstip over te kunnen gaan tot verwerving van terrein binnen de door de provincie vastgestelde EHS begrenzingsen.

Voor de aankoop van ruilgrond en bos- en natuurterreinen zijn geen prestaties afgesproken. De aankoop van ruilgrond heeft in 2009 en 2010 plaatsgevonden. In de opgave 2011 zijn geen aankopen van ruilgronden gerapporteerd. In 2011 zijn door een aantal provincies correcties aangebracht over voorgaande jaren, waardoor de mutatie in 2011 negatief is.

In de volgende grafiek is te zien hoe de verwervingsinspanning over de periode 2007 tot en met 2011 is geweest. Hieruit blijkt dat de verwervingsinspanningen in 2011 sterk zijn afgenomen.

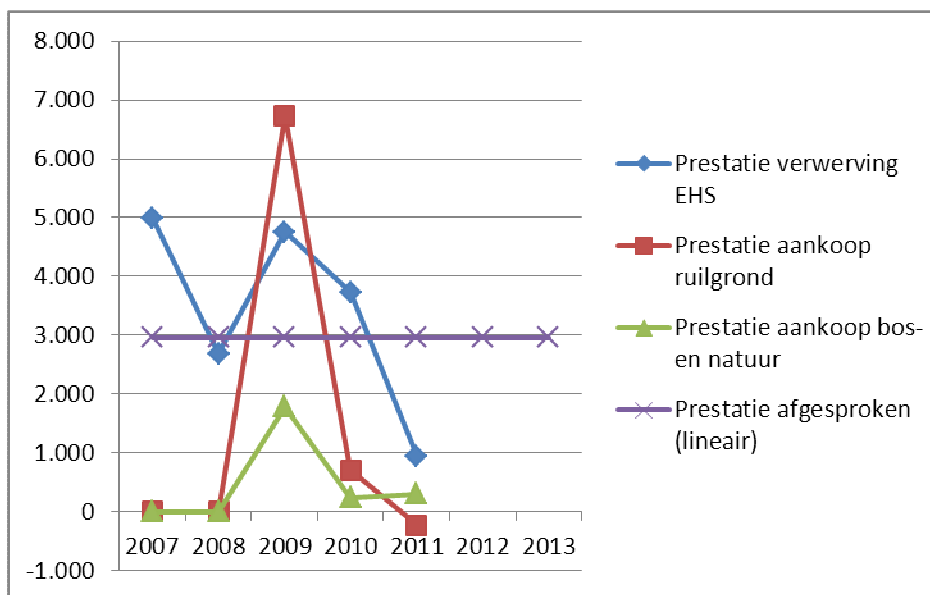


Grafiek 5.3

De inzet van BBL gronden blijft aanmerkelijk achter bij de mogelijkheden. In totaal was in 2007 ruim 17.000 hectare beschikbaar gesteld. De oorzaak van dit achterblijven zal bij de beoordeling van de prestaties per provincie nader worden onderzocht.

De inspanning voor verwerving is tot en met 2010 aanmerkelijk hoger geweest dan de aanvankelijke taakstelling.

Aan terreinbeherende organisaties is volgens opgave over de gehele periode 2007 tot en met 2011 bijna 7.500 hectare overgedragen.

De cumulatieve bestedingen voor verwerving EHS geven het volgende beeld.

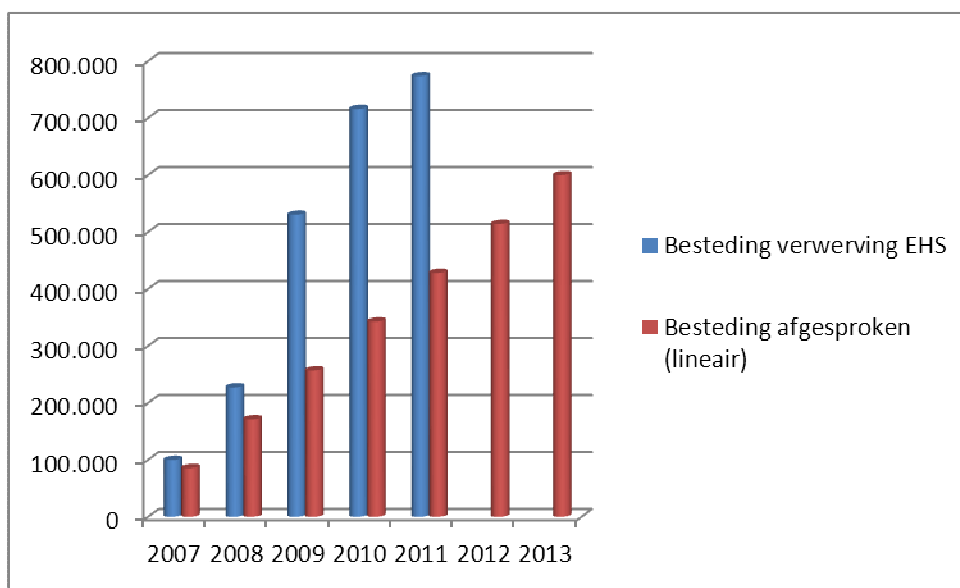

Grafiek 5.4


Het bestedingsniveau op het onderdeel verwerving is in verhouding tot de totale taakstelling ongeveer 29% hoger geweest dan de aanvankelijke afspraken. Daarmee is minder hectares aangekocht dan aanvankelijk beoogd. Er moet rekening mee worden gehouden dat ook gronden zijn verworven met gelden van derden. De omvang hiervan is door de provincies over 2010 en 2011 niet opgegeven.

Inrichting

In onze voorgaande rapportages en ook bij de Mid Term review in 2010 is reeds melding gemaakt van achterblijvende resultaten. Deze tendens heeft zich in 2011 voortgezet.


Onderstaand wordt de cumulatieve ontwikkeling van de inrichtingsactiviteiten binnen de EHS getoond.

Cumulatieve prestaties inrichting EHS ten opzicht van de prestatieafpraak

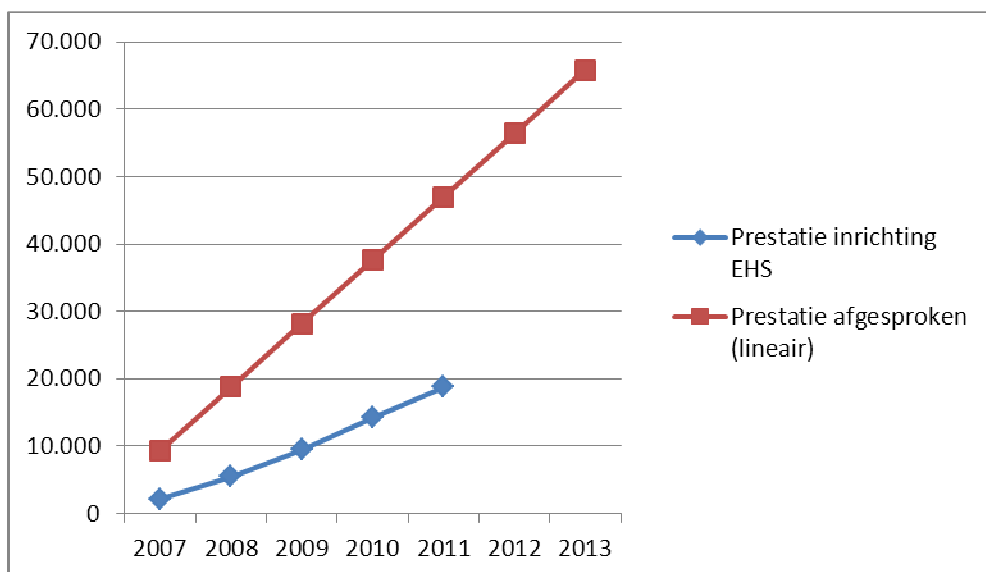

Grafiek 5.5


De ontwikkeling op jaarbasis laat zien dat tot en met 2010 sprake is geweest van een jaarlijkse toename in activiteit. Het jaar 2011 geeft echter een lichte daling te zien. Tot en met 2011 is volgens opgave ca 29% gerealiseerd.

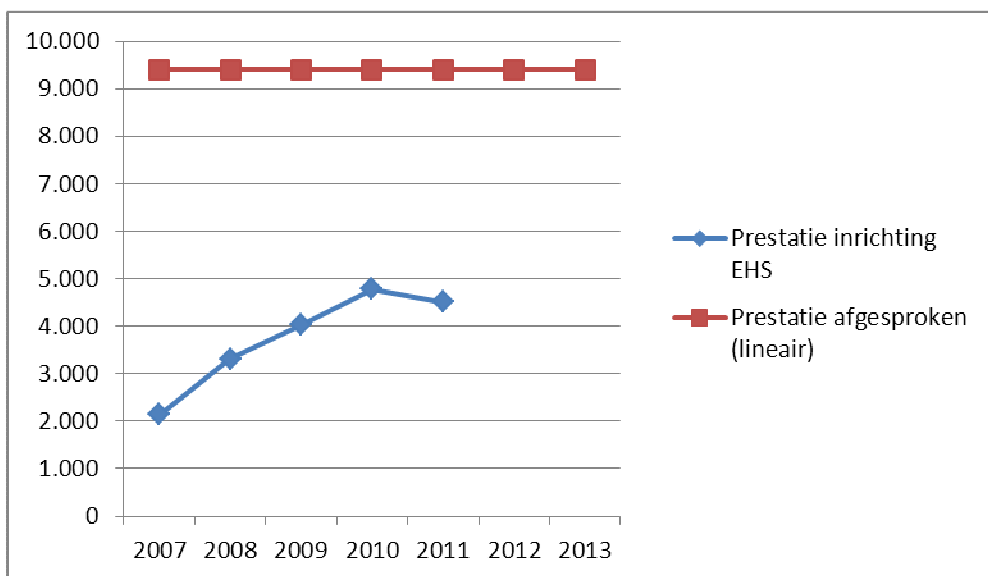

Grafiek 5.6

De bestedingen voor inrichting geven het volgende beeld.

Cumulatieve besteding inrichting EHS ten opzichte van de beschikbare rijksbijdrage

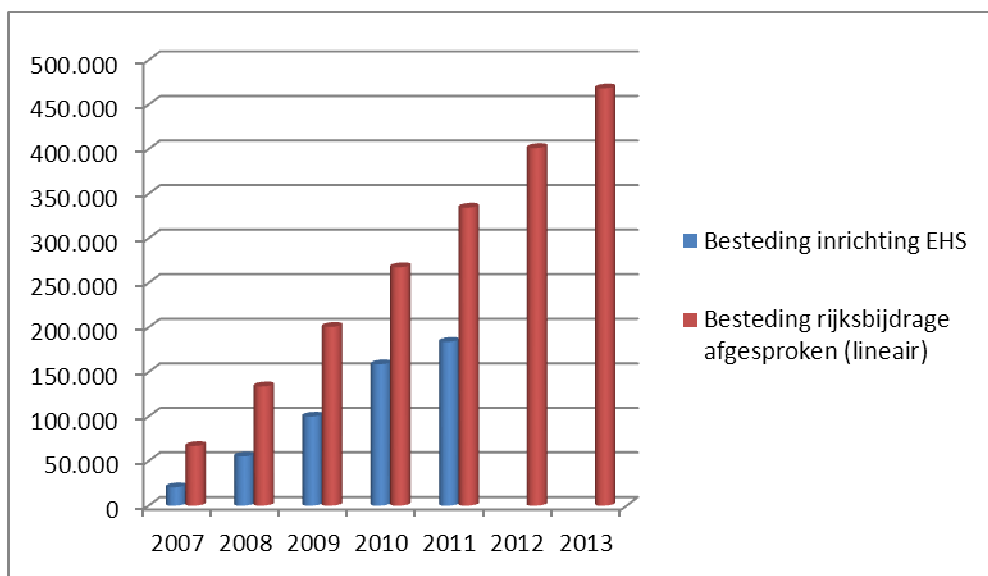


Grafiek 5.7

De bestedingen blijven zoals vermeld fors achter op de beschikbare budgetten. De bestedingen zijn ca 39% van het beschikbare budget en laten ten opzichte van de aanvankelijk afgesproken normkosten een behoorlijke overschrijding zien.

Beheer

Het beheer binnen de EHS is nog enigszins achtergebleven ten opzichte van het verwachte niveau. Het onvoldoende realiseren van de inrichting zal hier mede oorzaak van zijn.

Cumulatieve prestaties beheer EHS ten opzichte van het afgesproken niveau

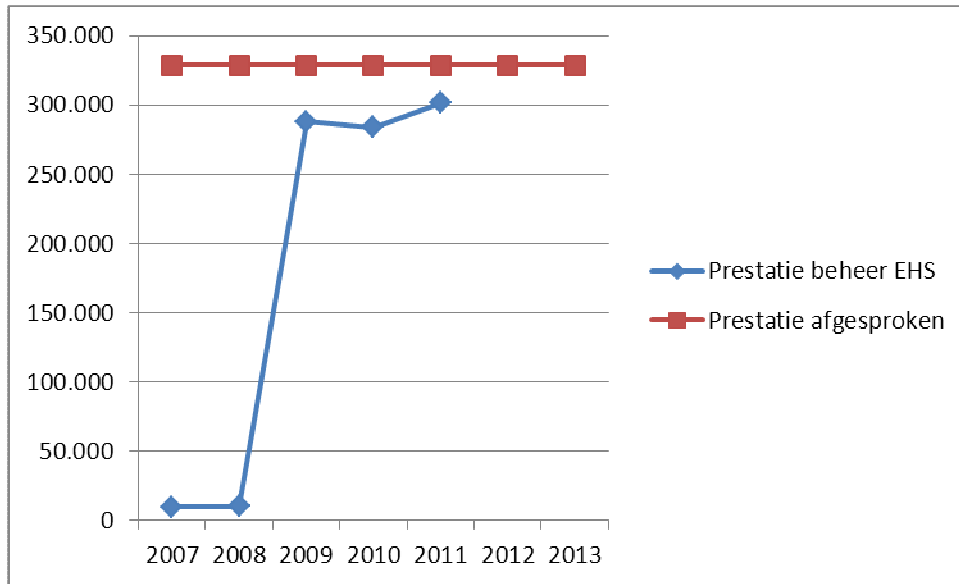

Grafiek 5.8

Overige onderwerpen EHS

De opgave 'Veenweidegebieden heeft aanmerkelijk meer prestaties opgeleverd dan aanvankelijk verwacht. In totaal zijn 88.000 hectare opgegeven tegen een voorgenomen aantal van 51.000. De opgegeven besteding zijn 59% van het beschikbare budget.

De afgesproken prestaties met betrekking tot de ecologische verbindingzones (EVZ) en de oplossing van knelpunten is hoegenaamd niet van de grond gekomen.

5.2.2 Natuur buiten de EHS

De natuurdoelen buiten de EHS bestaan uit verbetering van milieukwaliteit om te kunnen voldoen aan onder meer de Vogel – en Habitatrichtlijn (VHR), de ontwikkeling van nationale parken, soortenbescherming, inrichting rond de Westerschelde, natuurbeheer en onder meer de instandhouding van schaapskuddes (overige natuur).

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---------------------------|----------|------------|------------|------|----------------|----------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie | | BO | Realisatie | |
| | | PE | T/m 2011 | % | x € 1.000 | T/m 2011 | % |
| 1. Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 98.230 | 3.492 | 4% | 255.480 | 71.760 | 28% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 30 | 0 | 0% | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 126 | 97 | 79% | 30.761 | 19.246 | 63% |
| Soortenbescherming | AANT | 84 | 69 | 82% | 17.224 | 7.435 | 43% |
| Westerschelde | HA | 600 | 385 | 64% | 138.050 | 40.044 | 29% |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 59.958 | 51.781 | 86% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 39 | 56 | 144% | 11.380 | 4.834 | 42% |
| Totaal Euro | € | | | | 452.895 | 143.319 | 32% |

Tabel 5.2

Uit de gerapporteerde cijfers blijkt dat alle onderdelen met uitzondering van milieukwaliteit goed op schema liggen binnen de beschikbaar gestelde rijksbudgetten.

Het onderdeel milieukwaliteit is nog nauwelijks van de grond gekomen. Hoewel bijna 30% van het beschikbare budget is besteed, komen de opgegeven prestaties nog niet op 5%.

5.3 Landbouw

De natuurdoelen voor het onderdeel landbouw bestaan uit zogenaamd grondgebonden landbouw waaronder verbetering van de ruimtelijke structuur, inrichting en op peil houden van de grondvoorraad. Daarnaast is budget gereserveerd voor glastuinbouw, verspreid liggend glas en duurzaam ondernemen.


| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---------------------|----------|------------|------------------------|-----|----------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 143.369 | 91.233 | 64% | 100.310 | 100.722 | 100% |
| Overig landbouw | HA | 800 | 266 | 33% | 74.090 | 36.374 | 49% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 42 | 27 | 64% | 9.960 | 3.097 | 31% |
| Totaal Euro | € | | | | 184.360 | 140.193 | 76% |

Tabel 5.3

De prestaties in het onderdeel landbouw lopen als geheel licht achter op de lineaire verwachting

Van de verbetering van de ruimtelijke structuur en inrichting wordt in de volgende grafiek een overzicht gegeven


Cumulatieve prestaties inrichting grondgebonden landbouw

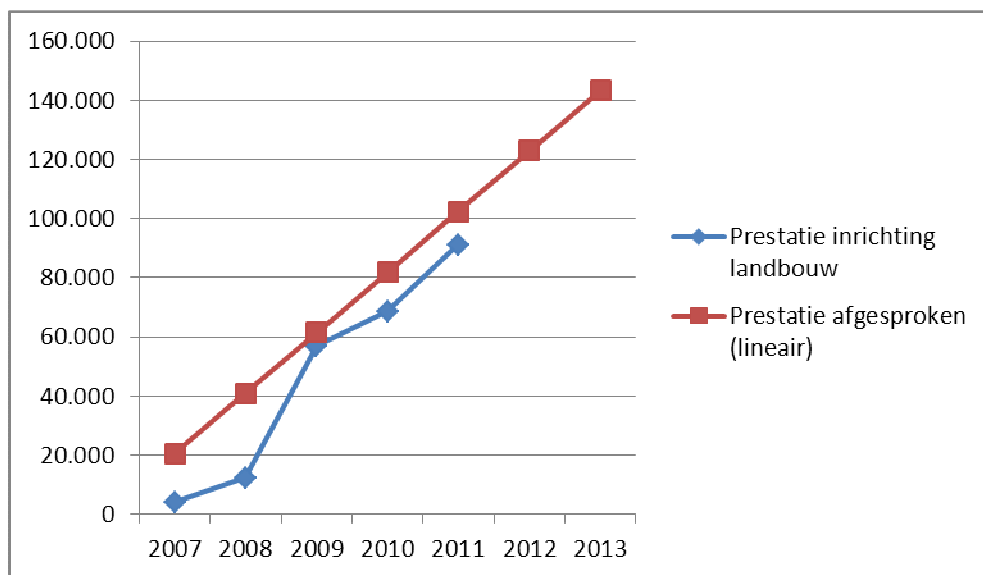

Grafiek 5.9


De prestaties per jaar geven aan dat na een neergang in 2010 de resultaten in 2011 weer een behoorlijke stijging laten zien.

Prestaties inrichting grondgebonden landbouw per jaar

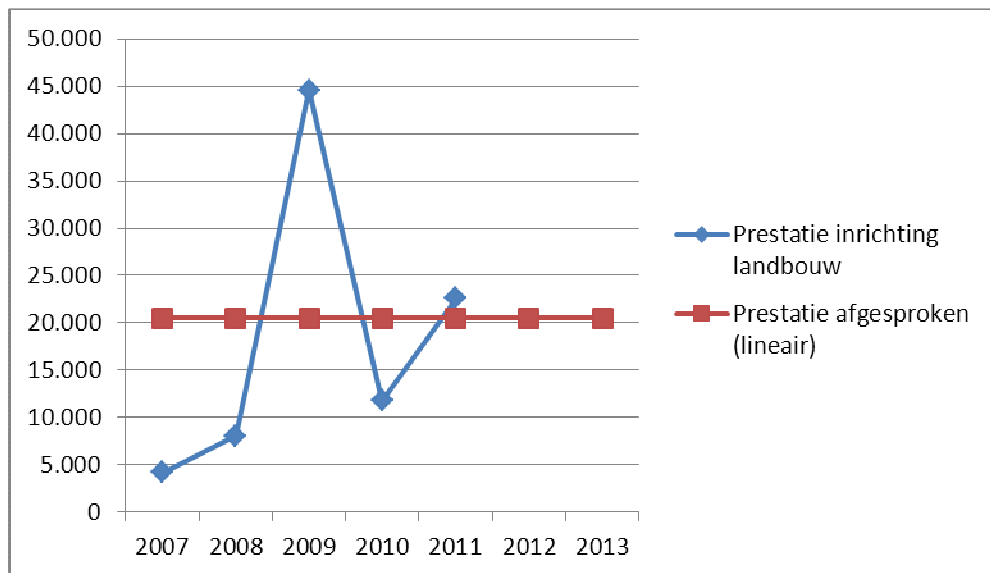

Grafiek 5.10

De bestedingen zijn aanmerkelijk hoger dan op grond van de prestaties mag worden verwacht.

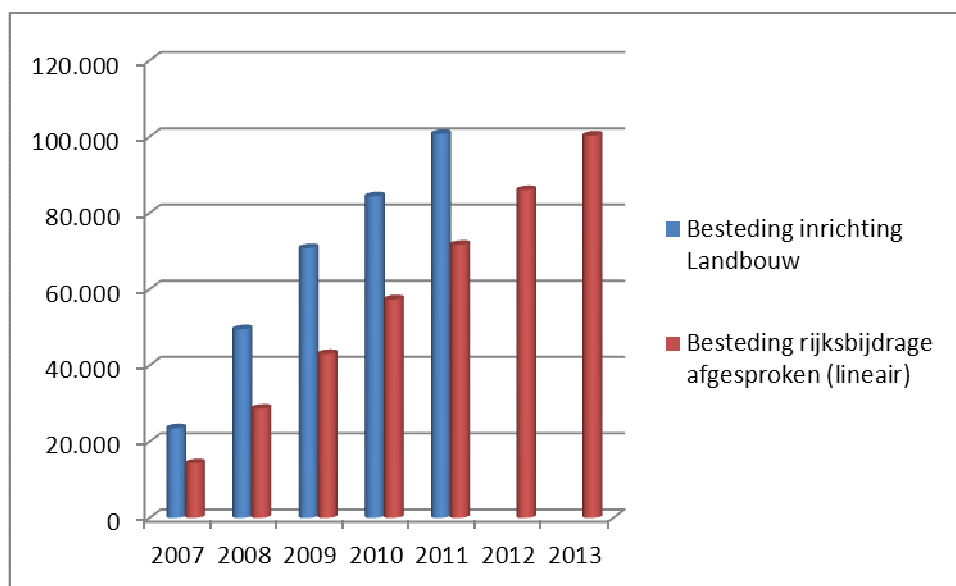

Grafiek 5.11

5.4 Recreatie

Een belangrijk onderdeel van het operationeel doel recreatie vormt de Recreatie rond de Stad (RodS), dat evenals de EHS bestaat uit verwervings- inrichtings- en beheerstaken. Daarnaast vormen het project Programma aanpassing Schiphol en Omgeving (Paso), de ontwikkeling van landelijke routenetwerken (wandelen, fietsen en varen), het ontwikkelen en versterken van de toegankelijkheid van recreatieve natuur en de natuurlijke inrichting van het Groene Hart de bestanddelen van dit ILG doel.


De gerapporteerde resultaten zijn als volgt:

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---------------------------|----------|------------|------------------------|------|----------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 3.754 | 1.892 | 50% | 316.040 | 168.710 | 53% |
| Ruilen Rods | HA | 3.577 | 1.193 | 33% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 1.148 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 117 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 500 | 0 | 0% | 25.900 | 0 | |
| Inrichten | HA | 2.064 | 451 | 22% | 38.410 | 9.649 | 25% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 4.210 | 1.267 | 30% | 99.440 | 25.978 | 26% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 468 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 133.713 | 180.093 | 135% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 27.800 | 10.088 | 36% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 144 | 128 | 89% | 39.230 | 11.653 | 30% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 2.677 | 1.827 | 68% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 546.820 | 226.078 | 41% |

Tabel 5.4

Verwerving

Cumulatieve prestatie verwerving recreatie om de stad (Rods)

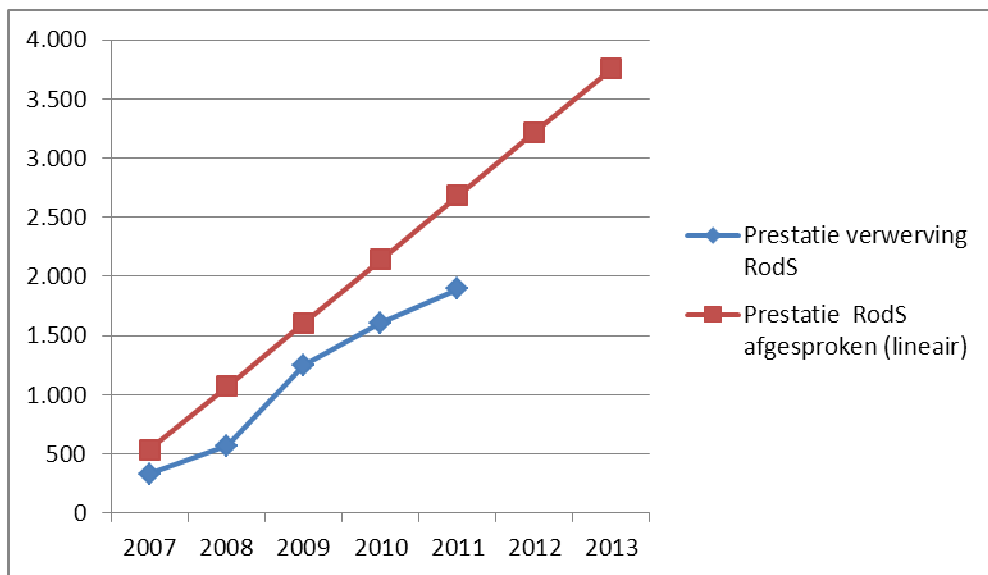


Grafiek 5.12

Ten behoeve van RodS is 1.892 ha verworven, waarvan 1.193 als ruilgronden. Er is volgens opgave 1.148 ha BBL grond ingezet en 117 ha overgedragen aan terreinbeheerders. Deze uitkomsten betekenen dat de realisatie van RodS nog ver verwijderd is.

Op jaarbasis geeft de verwerving het volgende beeld. Daaruit blijkt dat de verwervingsinspanningen over 2010 en 2011 aanzienlijk lager zijn geweest dan in 2009.


Prestatie verwerving recreatie om de stad (Rods) per jaar

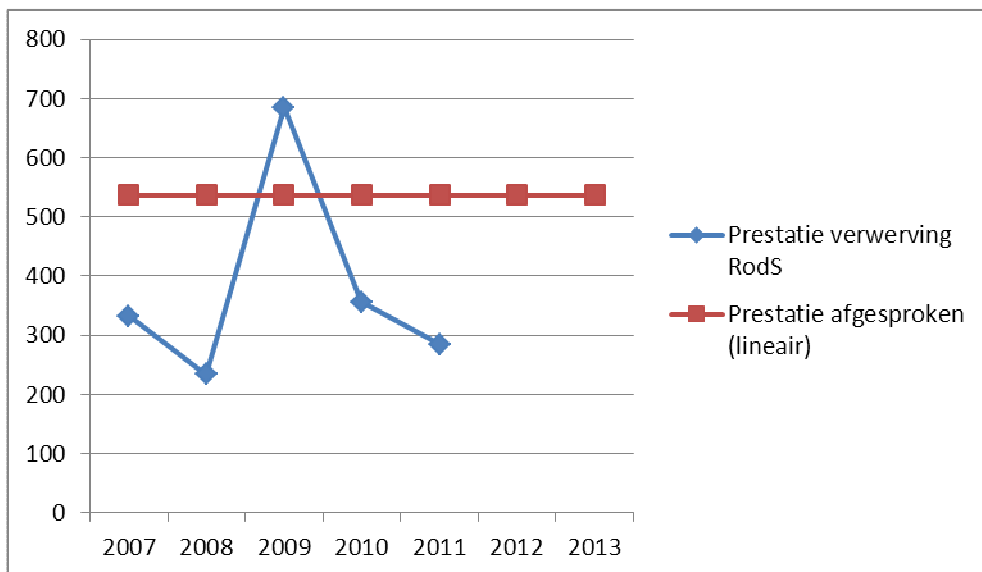

Grafiek 5.13

Onderstaand worden de cumulatieve bestedingen gegeven voor de verwerving van grond voor RodS.

Cumulatie bestedingen Rods

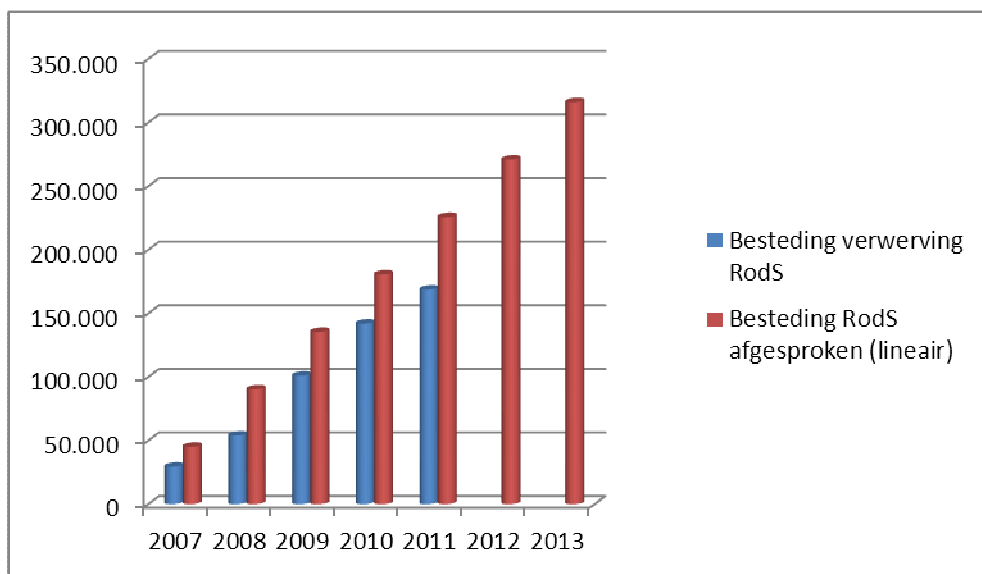


Grafiek 5.14

De verwervingsprestatie, inclusief ruilgrond (50%) heeft 53% van het beschikbare budget gekost.


Inrichting

De inrichting van recreatiegebieden blijft fors achter ten opzichte van de gemaakte afspraken, zoals uit onderstaande grafieken blijkt.

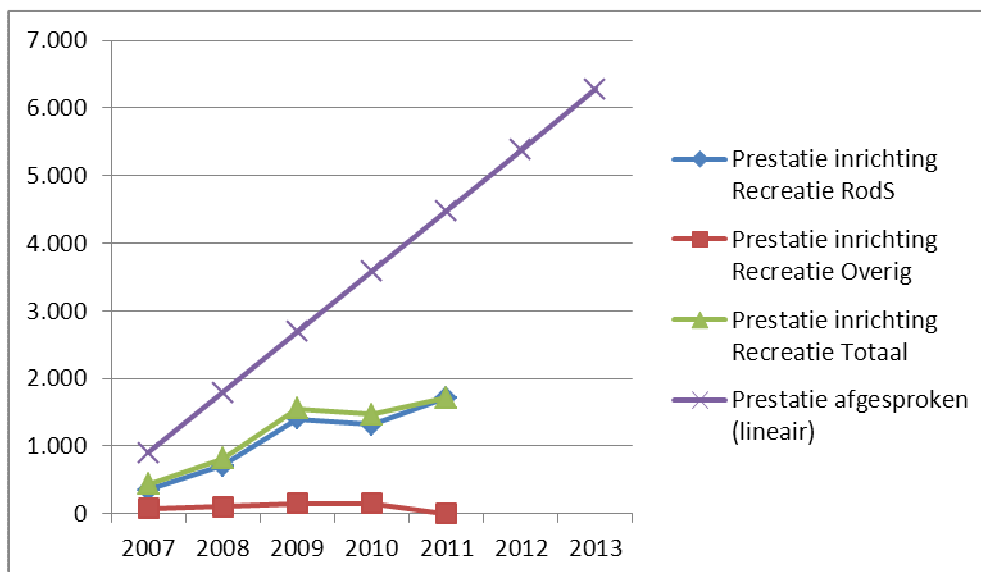Cumulatieve prestaties inrichting ten opzichte van de afgesproken prestaties

Grafiek 5.15

De bestedingen voor inrichting recreatie zijn eveneens fors achtergebleven en is sprake van onderbesteding ten opzichte van de gerapporteerde prestaties.

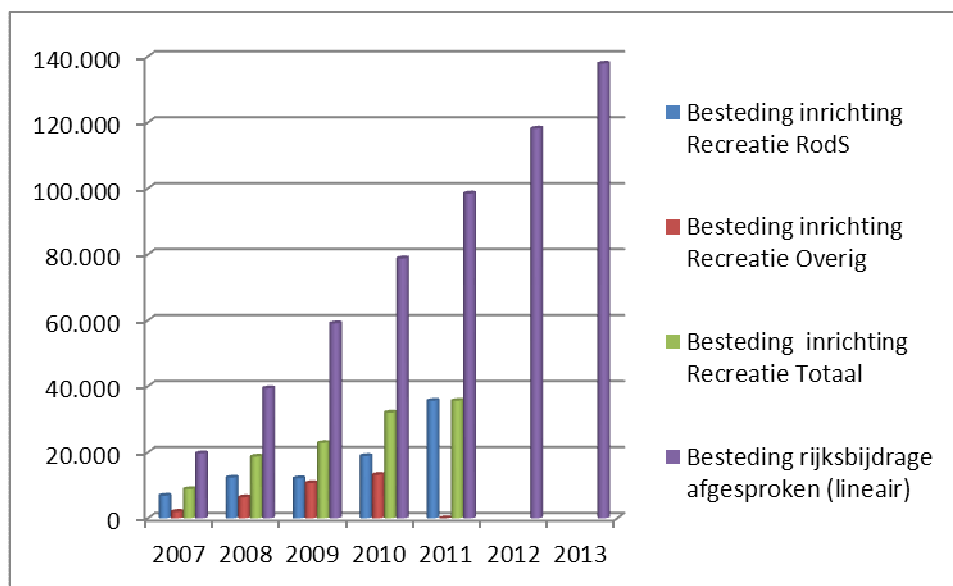
Cumulatieve bestedingen inrichting ten opzichte van de rijksbijdrage

Grafiek 5.16

Beheer recreatie

De cumulatieve prestatie voor beheer gaat aanmerkelijk uit boven de verwachting. De oorzaken hiervan moeten nog nader worden onderzocht, gezien de achterblijvende resultaten voor verwerving en inrichting.

Cumulatieve prestaties beheer recreatie

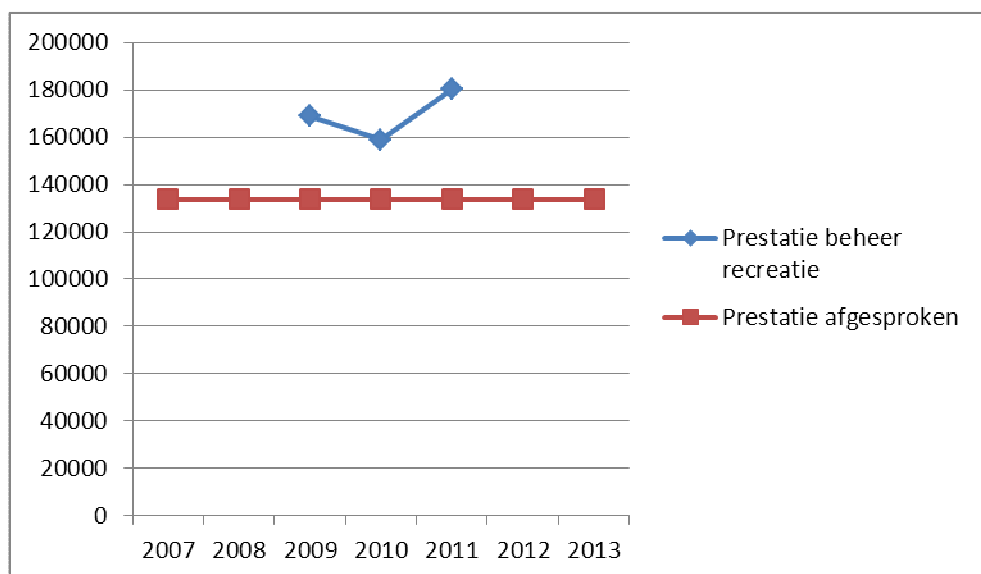

Grafiek 5.17

Overige onderwerpen recreatie

Groene Hart

Over de prestaties zijn op dit moment nog geen gegevens beschikbaar. Wel kan worden vastgesteld dat ongeveer 36% van het beschikbare budget is besteed.

Landelijke routenetwerken

De routenetwerken zowel in aan te leggen hectares als in kilometers liggen vrijwel op schema. De bestedingen blijven achter ten opzichte van het beschikbare budget.

5.5 Landschap

De investering in nationale landschappen betreft het ontwikkelen en het verzorgen van cultuurhistorie, bijdragen aan de provinciale stichtingen landschapsbeheer, het inrichten van bos en landschap in landinrichtingsprojecten, alsmede landschapgenerieke activiteiten in het kader van de inrichting van ruimtelijke structuren.


| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|--------------------|----------|------------|------------------------|-------|----------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 2.946 | 1.914 | 65% | 40.660 | 45.498 | 112% |
| Inrichten | KM | 2.403 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 7.909 | 84.879 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 512 | 100% | 86.318 | 10.123 | 79% |
| Overig landschap | AAANT | 12 | 126 | 1050% | | 21.423 | |
| Overig landschap | OPP | 16 | 3 | 19% | | 36.356 | |
| Totaal Euro | € | | | | 126.978 | 113.400 | 89% |

Tabel 5.5

Inrichting landschap

Van het onderdeel inrichting kan het volgende beeld worden gegeven.


Cumulatieve prestaties inrichting in hectares

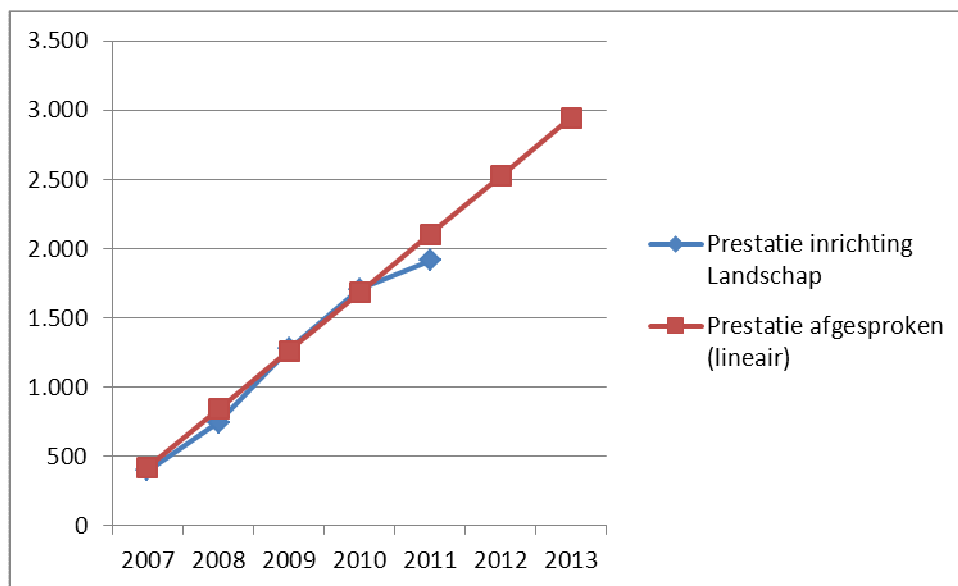

Grafiek 5.18

Hieruit lijkt naar voren te komen dat sprake is van lichte stagnatie.

Cumulatieve bestedingen landschap ten opzichte van de rijksbijdrage

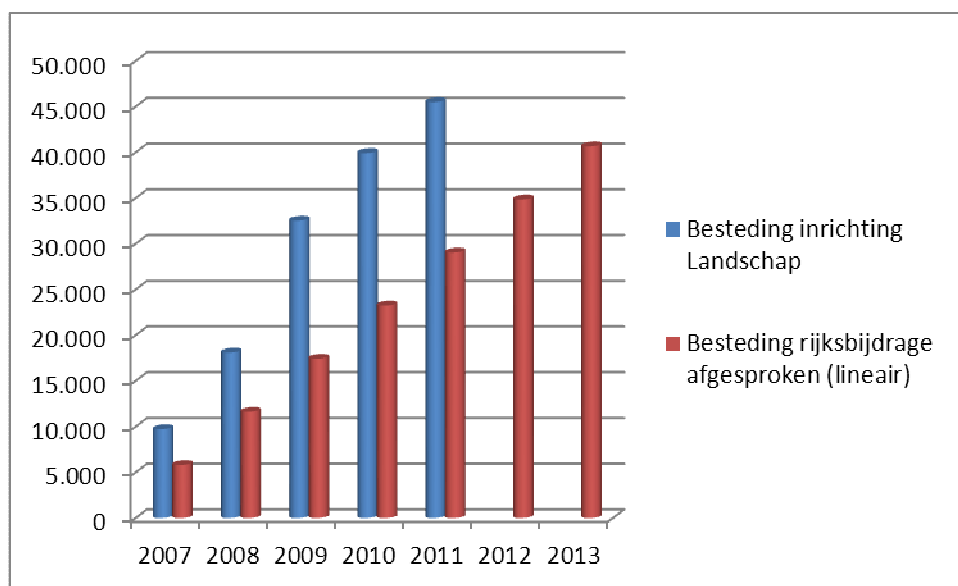


Grafiek 5.19

Inrichting landschap laat bij licht achterblijvende prestaties een forse overschrijding zien van de beschikbare rijksbijdrage.

Beheer landschap

De beheersinspanning ten behoeve van landschap is aanmerkelijk hoger dan verwacht. De oorzaken hiervan zullen nog nader worden onderzocht. Bij de indiening van de cijfers over 2011 zijn forse aanpassingen aangebracht.

Cumulatieve prestaties beheer landschap in hectares

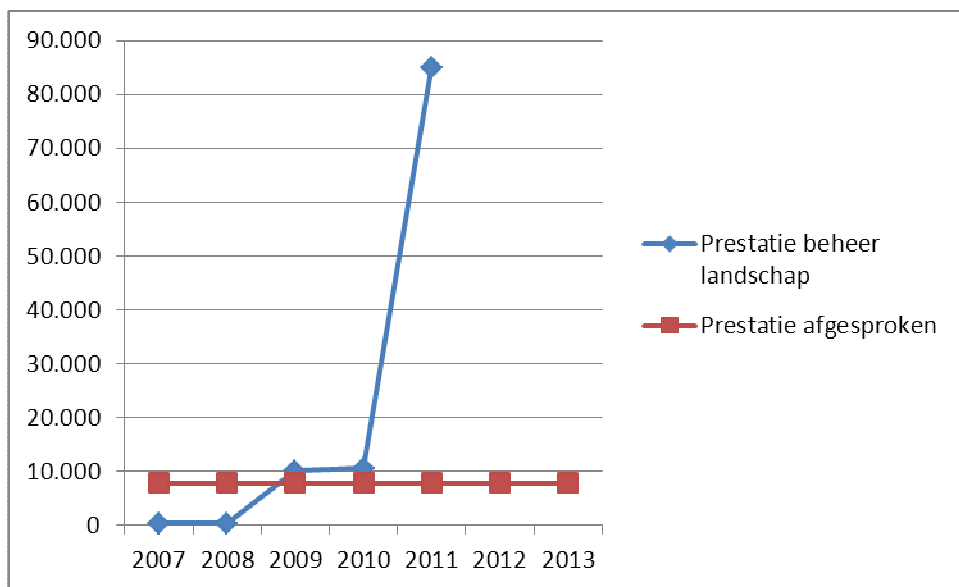

Grafiek 5.20

5.6 Bodem

Dit doel betreft duurzaam bodemgebruik (Pilots bodeminformatie en provinciale bodemvisie).

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|------------------|------|------------|---------------------|-----|---------------|---------------------|-----|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | % | BO | Realisatie T/m 2011 | % |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 49 | 24 | 49% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.250 | 1.830 | 35% |

Tabel 5.6

5.7 Water

Dit onderdeel betreft Waterkwaliteit (Waterbodemsanering 2010-2013) en Water (Synergiegelden)

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------|------|------------|---------------------|-----|---------------|---------------------|-----|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | % | BO | Realisatie T/m 2011 | % |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 83 | 52 | 63% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 129.442 | 21.886 | 17% |

Tabel 5.7

5.8 Aandachtsgebieden

Hieronder vallen de volgende aandachtsgebieden (de bedragen zijn opgenomen in de ILG beschikkingen).

| | X € 1.000 | X € 1.000 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| EHS- flankerend beleid; Terugdringen ammoniakemmissie | 44.170 | |
| Duurzaam waterbeheer | 66.020 | |
| Duurzame landbouw | 109.190 | |
| Overige rijksdoelen | 27.150 | |
| Uitfinancieren lopende verplichtingen Reconstructie Zandgebieden | 42.670 | |
| Totaal reconstuctie zandgebieden | | 289.200 |
| Veenweidegebieden | | 92.015 |
| Greenports | | 82.980 |
| Nieuwe Hollandse Waterlinie | | 33.600 |
| Overig | | 74.101 |
| Totaal | | 571.896 |

De opgegeven prestaties en bestedingen zijn als volg

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|----------------------------|----------|------------|------------------------|-----|----------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | % | BO | Realisatie T/m 2011 | % |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 57.931 | 8.006 | 14% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 1.336 | 591 | 44% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 284 | 109.900 | | | | |
| Totaal km | KM | 336 | 55 | 16% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 2.887.535 | 656.324 | 23% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 571.896 | 285.098 | 50% |

Tabel 5.8

Nadere informatie over de resultaten en bestedingen van dit onderdeel is nog niet beschikbaar.

5.9 Vitaliteit

Dit betreft de leefbaarheid Sociaal Economische Vitaliteit


| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-------------------------|----------|------------|------------------------|---|---------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | % | BO | Realisatie T/m 2011 | % |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 37 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.000 | 4.148 | 41% |

Tabel 5.9

De inspanningen op dit onderdeel zijn achtergebleven. Slechts één provincie heeft het volledige budget ingezet.


5.10 Samenvatting beheer

De totale prestatie beheer (EHS, natuur buiten EHS, Recreatie en Landschap samen) geeft het volgende beeld.

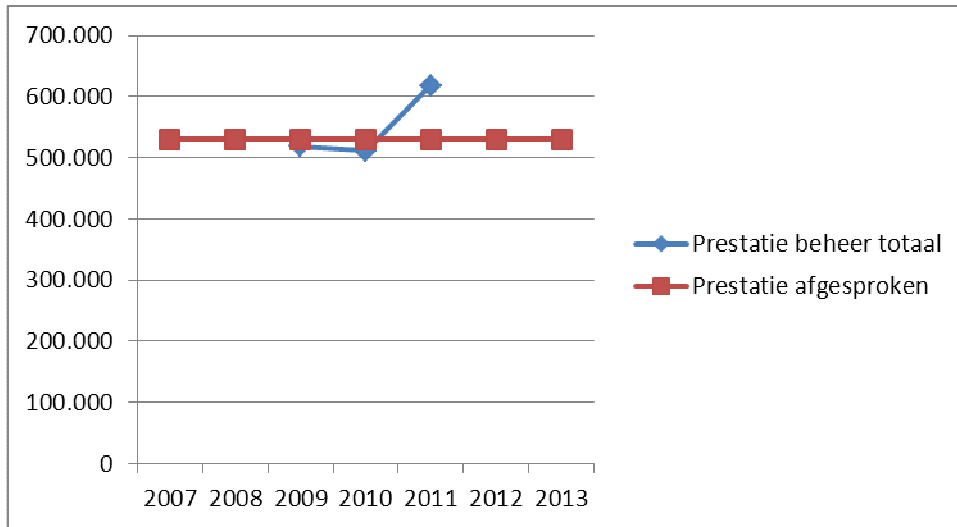

Grafiek 5.21

In de voortgangsrapportages zijn de bestedingen niet afzonderlijk opgenomen, maar als totaal van alle categorieën bij het onderdeel EHS.

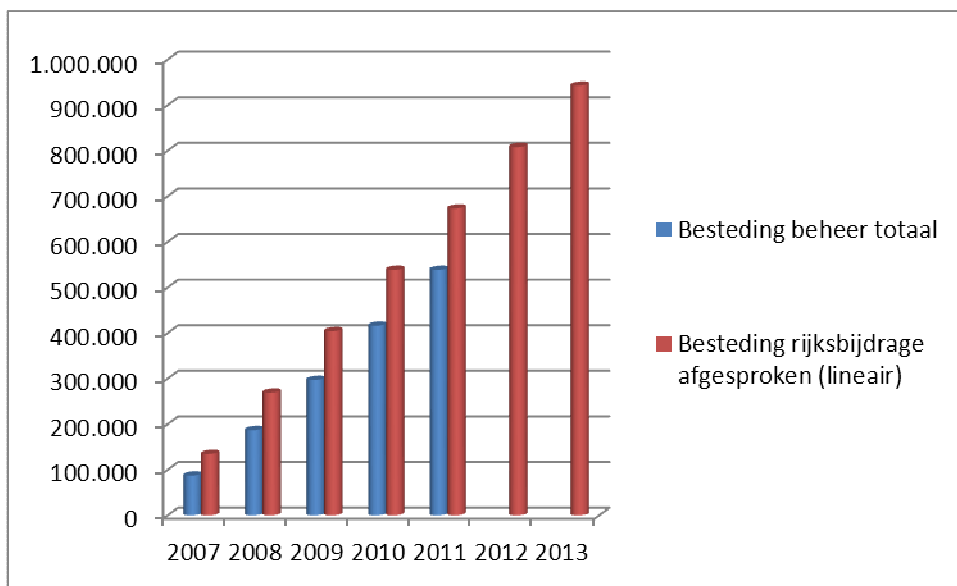

Grafiek 5.22

6. Betekenis van de uitgevoerde accountantscontrole voor de vaststelling van prestaties en bestedingen

In de 5^e rapportage van het Comité is een uitleg gegeven van de wijze waarop in hoofdlijnen de accountantscontrole van de bestedingen uit het ILG is geregeld. Zoals vermeld heeft het Comité nader onderzoek laten verrichten naar de betekenis van de beschikbare (accountants) controle verklaring voor de verantwoording van ILG prestaties en bestedingen. Voor de prestatiebeoordeling door het CvT ILG is het van belang te kunnen beschikken over betrouwbare informatie van de bestedingen per provincie.

Volgens de WILG rapporteren de provincies jaarlijks over de voortgang van het ILG (zie WILG artikel 12, eerste lid), gevolgd door een verantwoording na de periode van zeven jaar (zie WILG artikel 12 derde lid, artikel 7 eerste lid onderdeel a). De verantwoordingen bevatten zowel de financiële bijdragen aan het ILG (Rijk, provincie en derden) als prestaties.

Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat het ministerie in samenwerking met het IPO in 2008 een opzet heeft gemaakt voor de wijze van verantwoorden door de provincies, de controle van de financiële cijfers en de beoordeling van de prestaties. De afspraken voor de controle op de financiële cijfers ILG zijn in hoofdlijnen als volgt:

- De provincies verstrekken aan het Rijk een jaarlijkse (accountants)controleverklaring over de (cumulatief) bestede rijksbijdragen ILG. In deze verklaring wordt aangegeven dat de informatie rechtstreeks uit de jaarrekening van de provincie is af te leiden. Indien nodig wordt aanvullend een rapport van bevindingen verstrekt door de accountant;
- De provincies geven een volledige (accountants)controleverklaring en een rapport van bevindingen bij het eindverslag in 2014.

Over de periode 2007 tot en met 2011 is de controle van de externe accountants van de provincies om doelmatigheidsredenen ondersteund door de auditdienst van het Rijk. Deze ondersteuning betreft de uitgaven en ontvangsten die via de Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Dienst Regelingen (DR) zijn uitgevoerd. Deze diensten zijn als onderdeel van het ministerie door de eigen auditdienst gecontroleerd. Deze uitgaven en ontvangsten vormen een belangrijk gedeelte van ILG bestedingen. De controleuitkomsten zijn op basis van afspraken door de auditdienst gerapporteerd aan de provinciale accountants ten behoeve van hun controle op de jaarrekening van de provincie. De controle van de auditdienst is blijkens het onderzoek (nog) niet gericht geweest op de controle van de rijksbijdrage in het ILG als onderdeel van de rijksbegroting. Dit laatste is van belang omdat de controle-eisen voor provinciale jaarrekeningen en de rijksrekening niet gelijk zijn.

De controle werkzaamheden van de provinciale accountants gedurende de ILG periode zijn aan te merken als tussentijdse voorbereidende werkzaamheden voor de accountantscontrole van de financiële bijdragen van het Rijk oorspronkelijk in 2014.

Door het sluiten van het natuurakkoord is de voorgenomen ILG periode van 7 jaar tussentijds afgebroken en zal een aangepaste invulling moeten worden gegeven aan de accountantscontrole van de rijksbijdragen.

7. Werkwijze CvT ILG in verband met de prestatievaststelling

In bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van IPO en voormalig staatssecretaris Bleker zijn afspraken gemaakt over de implementatie van het natuurakkoord. Een element daarin is om op zo kort mogelijke termijn tot een afwikkeling te komen van de periode 2007 tot en met 2010. In ambtelijk overleg tussen het ministerie van EL&I en het IPO met het Comité van Toezicht ILG zijn inmiddels afspraken gemaakt over een plan van aanpak en de daarbij te volgen procedures.

De verantwoordelijkheid van het CvT ILG is om de bereikte resultaten vast te stellen, zodat een basis aanwezig is voor de afwikkeling van de bestuursovereenkomsten⁷.

In en bij de bestuursovereenkomsten zijn concrete afspraken gemaakt over de definitie van een prestatie (hectares, aantallen, kilometers, etc.), gerelateerd aan het te bereiken doel. Het CvT zal deze prestatie omschrijvingen hanteren. De gewenste doelen zijn geformuleerd in het provinciaal meerjarenplan en voor vele onderdelen nader geconcretiseerd in de oorspronkelijke bestuursovereenkomsten.

De voortgangsrapportages ILG van de afzonderlijke provincie over de periode 2007 tot en met 2010 vormen voor het Comité de basis voor de beoordeling van de prestaties. Het Comité is bezig de beschikbare informatie te ordenen en te analyseren. De uitkomsten hiervan zullen aan de provincies worden voorgelegd ter afstemming.

Gezien de omvang en de gevarieerdheid van de gerapporteerde prestaties zal het Comité de beoordeling in fasen verdelen:

1. Inrichting (per gebied) EHS, Landbouw, Recreatie en Landschap en de overige ILG doelen, met uitzondering van verwerving en beheer
2. Verwerving (aankoop, verkoop, ruiling, overdrachten)
3. Beheer EHS, Natuur buiten EHS, Recreatie, en Landschap.

In Januari 2013 zal worden gestart met het voorleggen van de aan het Comité beschikbaar gestelde informatie aan de afzonderlijke provincies. Daarbij zal worden gevraagd geconstateerde verschillen toe te lichten. Tevens zal worden gevraagd naar de stand van de gebiedsontwikkeling per 1 januari 2011. Het Comité streeft er naar zijn werkzaamheden mede in het licht van de afwikkelings-overeenkomsten tussen rijke en provincies van 23 November 2012 zo spoedig mogelijk af te ronden.

Het Comité zal naast de nodige administratieve afstemmingen, visitaties ter plaatse uitvoeren.

Elke fase zal in overleg met gedeputeerde staten van de provincie worden afgesloten met een voorlopige rapportage. Daaraan zullen de opvattingen van de provincie, als zichtbaar resultaat van 'hoor- en weder hoor', integraal worden toegevoegd in de eindrapportage van het Comité. De eindrapportage zal ter beschikking worden gesteld aan het College van gedeputeerde staten en aan de verantwoordelijke bewindspersoon van het rijk.

⁷ In de 5^e rapportage van het Comité is meer uitvoerig ingegaan op de wijze van beoordeling van provinciale prestaties in het kader van de geldende bestuursovereenkomsten.

Annex 1 Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie tot en met 2011

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------|------|------------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 20.734 | 17.103 | 82% | 599.836 | 775.665 | 129% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 7.195 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 2.330 | | 0 | 4.230 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 17.546 | 3.071 | 18% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 7.495 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 65.781 | 18.758 | 29% | 468.230 | 183.830 | 39% |
| Beheer | HA | 328.721 | 301.380 | 92% | 942.452 | 528.532 | 57% |
| Veenweidegebied | HA | 51.000 | 88.010 | 173% | 7.960 | 4.068 | 51% |
| EVZ's | HA | 1.027 | 52 | 5% | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 36 | 6 | 17% | 105.300 | 17.679 | 17% |
| Totaal Euro | € | | | | 2.123.778 | 1.524.004 | 72% |
| 1 Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 98.230 | 3.492 | 4% | 255.480 | 71.760 | 28% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 30 | 0 | 0% | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 126 | 97 | 79% | 30.761 | 19.246 | 63% |
| Soortenbescherming | AANT | 84 | 69 | 82% | 17.224 | 7.435 | 43% |
| Westerschelde | HA | 600 | 385 | 64% | 138.050 | 40.044 | 29% |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 59.958 | 51.781 | 86% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 39 | 56 | 144% | 11.380 | 4.834 | 42% |
| Totaal Euro | € | | | | 452.895 | 143.319 | 32% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 143.369 | 91.233 | 64% | 100.310 | 100.722 | 100% |
| Overig landbouw | HA | 800 | 266 | 33% | 74.090 | 36.374 | 49% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 42 | 27 | 64% | 9.960 | 3.097 | 31% |
| Totaal Euro | € | | | | 184.360 | 140.193 | 76% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 3.754 | 1.892 | 50% | 316.040 | 168.710 | 53% |
| Ruilen Rods | HA | 3.577 | 1.193 | 33% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 1.148 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 117 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 500 | 0 | 0% | 25.900 | 0 | |
| Inrichten | HA | 2.064 | 451 | 22% | 38.410 | 9.649 | 25% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 4.210 | 1.267 | 30% | 99.440 | 25.978 | 26% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 468 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 133.713 | 180.093 | 135% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 27.800 | 10.088 | 36% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 144 | 128 | 89% | 39.230 | 11.653 | 30% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 2.677 | 1.827 | 68% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 546.820 | 226.078 | 41% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 2.946 | 1.914 | 65% | 40.660 | 45.498 | 112% |
| Inrichten | KM | 2.403 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 7.909 | 84.879 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 512 | 100% | 86.318 | 10.123 | 79% |
| Overig landschap | AANT | 12 | 126 | 50% | | 21.423 | |
| Overig landschap | OPP | 16 | 3 | 19% | | 36.356 | |
| Totaal Euro | € | | | | 126.978 | 113.400 | 89% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 49 | 24 | 49% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.250 | 1.830 | 35% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 83 | 52 | 63% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 129.442 | 21.886 | 17% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 57.931 | 8.006 | 14% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 1.336 | 591 | 44% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 284 | 109.900 | | | | |
| Totaal km | KM | 336 | 55 | 16% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 2.887.535 | 656.324 | 23% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 571.896 | 285.098 | 50% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 37 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.000 | 4.148 | 41% |
| Totaal Euro | € | | | | 4.151.419 | 2.459.956 | 59% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -432.699 | -186.337 | |
| Totaal via ILG | | | | | 3.718.720 | 2.273.619 | |

| Groningen | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------|------|----------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 913 | 1.673 | 183% | 18.374 | 11.796 | 64% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.525 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 5.209 | 1.665 | 32% | 25.510 | 15.584 | 61% |
| Beheer | HA | 14.550 | 11.167 | 77% | 59.074 | 35.863 | 61% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 6 | 4 | 67% | 19.200 | 409 | 2% |
| Totaal Euro | € | | | | 122.158 | 63.652 | 52% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | HA | 3.672 | 0 | 0% | 10.460 | 6.580 | 63% |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 7 | 5 | 71% | 799 | 700 | 88% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 8 | 114% | 1.102 | 547 | 50% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 3.580 | 5.617 | 157% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 1 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 12.511 | 7.827 | 63% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 14.448 | 26.388 | 183% | 8.330 | 6.464 | 78% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 14.830 | 7.717 | 52% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 7 | 11 | 157% | 830 | 162 | 20% |
| Totaal Euro | € | | | | 23.990 | 14.343 | 60% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 33 | 0 | 0% | 589 | 506 | 86% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 25 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 1.606 | 9.909 | | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 9 | 3 | 33% | 3.429 | 318 | 9% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 250 | 105 | 42% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 4.018 | 824 | 21% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 194 | 138 | 71% | 2.890 | 2.209 | 76% |
| Inrichten | KM | 71 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 250 | 11.518 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 3.772 | 599 | 68% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | | 1.806 | |
| Overig landschap | OPP | 1 | 0 | | | 173 | |
| Totaal Euro | € | | | | 6.662 | 4.787 | 72% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 3 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 0 | 0% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 5 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.329 | 0 | 0% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 0 | |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 132 | 16% |
| Totaal Euro | € | | | | 175.951 | 91.565 | 52% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -18.824 | -3.909 | |
| Totaal via ILG | | | | | 157.127 | 87.656 | |

| Friesland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|------|----------------|----------------|-------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie | | BO | Realisatie | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 2.250 | 906 | 40% | 44.710 | 17.665 | 40% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 433 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 208 | | 0 | 1.389 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.662 | 569 | 34% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 1.147 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 6.346 | 3.047 | 48% | 47.860 | 18.425 | 38% |
| Beheer | HA | 33.941 | 32.662 | 96% | 142.312 | 87.287 | 61% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 4 | 0 | 0% | 8.730 | 127 | 1% |
| Totaal Euro | € | | | | 243.612 | 124.893 | 51% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 3.507 | 1 | 0% | 15.010 | 8.140 | 54% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 14 | 10 | 71% | 2.920 | 1.841 | 63% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 9 | 129% | 1.777 | 389 | 22% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 6.095 | 11.619 | 191% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 2 | 3 | 150% | 240 | 135 | 56% |
| Totaal Euro | € | | | | 19.947 | 10.505 | 53% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 20.173 | 5.979 | 30% | 12.700 | 19.988 | 157% |
| Overig landbouw | HA | 100 | 0 | 0% | 3.600 | 3.619 | 101% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 9 | 1 | 11% | 830 | 349 | 42% |
| Totaal Euro | € | | | | 17.130 | 23.956 | 140% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 27 | | 0 | 0 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 1 | 29 | | 971 | 526 | 54% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 24 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 5.242 | 13.471 | | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 12 | 3 | 25% | 4.639 | 1.873 | 40% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 309 | 246 | 80% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.610 | 2.399 | 43% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 144 | 156 | 108% | 4.770 | 3.087 | 65% |
| Inrichten | KM | 223 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 1.361 | 2.475 | 182% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 507 | | 5.762 | 1.211 | 99% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | | 1.811 | |
| Overig landschap | OPP | 2 | 0 | 0% | | 2.665 | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.532 | 8.832 | 83% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 2 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 84 | 19% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 4 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 14.153 | 2.445 | 17% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 0 | |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 333 | 40% |
| Totaal Euro | € | | | | 312.267 | 173.389 | 56% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -43.129 | -5.958 | |
| Totaal via ILG | | | | | 269.138 | 167.431 | |

| Drenthe | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------|------|----------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.638 | 1.427 | 87% | 31.044 | 47.855 | 154% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 264 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 99 | | 0 | 804 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.903 | 364 | 19% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 1.227 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 8.456 | 1.677 | 20% | 46.490 | 24.556 | 53% |
| Beheer | HA | 21.066 | 21.817 | 104% | 69.580 | 32.737 | 47% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 3 | 0 | 0% | 9.070 | 425 | 5% |
| Totaal Euro | € | | | | 156.184 | 106.377 | 68% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 13.316 | 2.269 | 17% | 36.470 | 6.449 | 18% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 21 | 16 | 76% | 5.158 | 3.544 | 69% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 9 | 129% | 1.389 | 199 | 14% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 3.671 | 2.244 | 53% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 6 | 9 | 150% | 800 | 819 | 102% |
| Totaal Euro | € | | | | 43.817 | 11.011 | 25% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 13.004 | 8.895 | 68% | 12.390 | 10.027 | 81% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 6.170 | 6.178 | 100% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 1 | 4 | 400% | 830 | 397 | 48% |
| Totaal Euro | € | | | | 19.390 | 16.602 | 86% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 6 | 25 | | 1.200 | 441 | 37% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 95 | 0 | | | | |
| Beheer | HA | 12.615 | 19.082 | 151% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 6 | 0 | 0% | 5.342 | 1.888 | 35% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 367 | 7 | 2% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 6.542 | 2.329 | 36% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 720 | 386 | 54% | 5.910 | 5.667 | 96% |
| Inrichten | KM | 235 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 363 | 21.243 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 4.794 | 33 | 97% |
| Overig landschap | AANT | 1 | 6 | 0% | | 4.083 | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | | | 552 | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.704 | 10.335 | 97% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 2 | 1 | 50% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 68 | 15% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 7 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 11.095 | 3.219 | 29% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 82 | |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 249.015 | 150.023 | 60% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -25.772 | -12.637 | |
| Totaal via ILG | | | | | 223.243 | 137.386 | |

| Overijssel | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|------|----------------|----------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie | | BO | Realisatie | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Vererving | HA | 3.398 | 2.626 | 77% | 94.880 | 119.195 | 126% |
| Vererving EHS ruilgrond | HA | 0 | 1.513 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 42 | | 0 | 278 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.667 | 601 | 36% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 711 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 7.269 | 1.764 | 24% | 51.930 | 16.476 | 32% |
| Beheer | HA | 35.381 | 27.149 | 77% | 89.455 | 51.296 | 57% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 3 | 0 | 0% | 9.120 | 26 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 245.385 | 187.271 | 76% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 1.711 | 0 | 0% | 23.900 | 4.237 | 18% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 14 | 10 | 71% | 5.035 | 3.114 | 62% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 7 | 100% | 1.777 | 822 | 46% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 6.147 | 3.002 | 49% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 2 | 3 | 150% | 2.090 | 452 | 22% |
| Totaal Euro | € | | | | 32.802 | 8.625 | 26% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 15.988 | 9.948 | 62% | 10.920 | 5.224 | 48% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 1.400 | 435 | 31% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 3 | 1 | 33% | 830 | 700 | 84% |
| Totaal Euro | € | | | | 13.150 | 6.359 | 48% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 25 | 13 | 52% | 887 | 1.533 | 173% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 45 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 17.643 | 23.288 | 132% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 20 | 17 | 85% | 2.854 | 1.022 | 36% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 194 | 48 | 25% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 3.741 | 2.555 | 68% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 73 | 74 | 101% | 4.360 | 2.662 | 61% |
| Inrichten | KM | 408 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 1.745 | 1.246 | 71% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 6.078 | 0 | 78% |
| Overig landschap | AANT | 2 | 0 | | | 1.809 | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | | | 2.913 | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.438 | 7.384 | 71% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 5 | 5 | 100% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 352 | 78% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 6 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 12.330 | 4.365 | 35% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 21.983 | 7.470 | 34% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 54 | 491 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 256 | 109.900 | | | | |
| Totaal km | KM | 88 | 55 | 63% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 2.887.535 | 656.324 | 23% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 55.020 | 32.671 | 59% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 26 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 154 | 18% |
| Totaal Euro | € | | | | 374.149 | 249.736 | 67% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -66.306 | -18.416 | |
| Totaal via ILG | | | | | 307.843 | 231.320 | |

| Gelderland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------|------|----------------|------------------------|-------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.052 | 1.156 | 110% | 36.808 | 61.491 | 167% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 891 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 23 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 2.958 | 86 | 3% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 600 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 6.112 | 978 | 16% | 43.640 | 17.844 | 41% |
| Beheer | HA | 67.310 | 62.350 | 93% | 141.803 | 87.302 | 62% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 6 | 0 | 0% | 17.690 | 12.917 | 73% |
| Totaal Euro | € | | | | 239.941 | 179.554 | 75% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 5.218 | 860 | 16% | 29.810 | 10.061 | 34% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 30 | 0 | 0% | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 0 | 0% | 1.389 | 584 | 42% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 12.505 | 2.170 | 17% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 10 | 10 | 100% | 2.910 | 1.930 | 66% |
| Totaal Euro | € | | | | 34.109 | 12.575 | 37% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 15.351 | 23.185 | 151% | 7.230 | 7.722 | 107% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 6.620 | 0 | 0% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 0 | 0 | | 830 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 14.680 | 7.722 | 53% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 206 | 167 | 81% | 16.840 | 24.419 | 145% |
| Ruilen Rods | HA | 119 | 156 | 131% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 11 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 373 | 0 | 0% | 8.110 | 0 | 0% |
| Inrichting Rods (lop. Verpl.) | HA | 142 | 12 | 8% | 4.785 | 2.030 | 42% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 52 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 34.891 | 15.152 | 43% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 18 | 43 | 239% | 2.957 | 747 | 25% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 183 | 859 | 468% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 32.692 | 27.196 | 83% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 115 | 130 | 113% | 1.990 | 1.181 | 59% |
| Inrichten | KM | 259 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 2.641 | 1.781 | 67% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 14.862 | 0 | 107% |
| Overig landschap | AANT | 7 | 0 | 0% | | 1.903 | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | | | 14.046 | |
| Totaal Euro | € | | | | 16.852 | 17.130 | 102% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 5 | 4 | 80% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 433 | 96% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 11 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 17.005 | 2.203 | 13% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 15.050 | 0 | 0% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 241 | 0 | 0% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 24 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 100 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 98.300 | 37.884 | 39% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 4 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 428 | 51% |
| Totaal Euro | € | | | | 454.862 | 285.125 | 63% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -36.847 | -1.054 | |
| Totaal via ILG | | | | | 418.015 | 284.071 | |

| Utrecht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|------|----------------|----------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie | | BO | Realisatie | |
| | | PE | T/m 2011 | % | x € 1.000 | T/m 2011 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.494 | 633 | 42% | 50.672 | 69.572 | 137% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 380 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 377 | | 0 | 1500 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 672 | 74 | 11% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 188 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 3.892 | 307 | 8% | 28.440 | 8.270 | 29% |
| Beheer | HA | 16.609 | 15.858 | 95% | 62.976 | 37.908 | 60% |
| Veenweidegebied | HA | 8.734 | 15.292 | 175% | 821 | 0 | 0% |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 1 | 0 | 0% | 4.500 | 651 | 14% |
| Totaal Euro | € | | | | 147.409 | 117.901 | 80% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 6.277 | 0 | 0% | 17.290 | 4.756 | 28% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 7 | 15 | 214% | 2.003 | 522 | 26% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 11 | 157% | 1.593 | 168 | 11% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 2.871 | 3.018 | 105% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 0 | 1 | | 0 | 42 | |
| Totaal Euro | € | | | | 20.886 | 5.488 | 26% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 4.710 | 321 | 7% | 6.530 | 2.852 | 44% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 10 | 6 | 60% | 830 | 125 | 15% |
| Totaal Euro | € | | | | 7.360 | 2.977 | 40% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 367 | 170 | 46% | 27.220 | 18.267 | 67% |
| Ruilen Rods | HA | 174 | 123 | 71% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 9 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 152 | 5 | 3% | 3.300 | 529 | 16% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 539 | 435 | 81% | 10.329 | 3.040 | 29% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 12 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 8.997 | 10.524 | 117% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 10.800 | 4.698 | 44% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 10 | 43 | | 2.274 | 1.607 | 71% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 172 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 53.923 | 28.141 | 52% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 22 | 15 | 68% | 3.520 | 1.328 | 38% |
| Inrichten | KM | 67 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 309 | 12.630 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 5 | | 9.505 | 1.154 | 68% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | | 718 | |
| Overig landschap | OPP | 4 | 0 | 0% | | 4.617 | |
| Totaal Euro | € | | | | 13.025 | 7.817 | 61% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 4 | 1 | 25% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 0 | 0% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 7 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 7.549 | 537 | 7% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 7.387 | 184 | 2% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 144 | 55 | 38% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 4 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 78 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 61.260 | 16.072 | 26% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 1 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 728 | 87% |
| Totaal Euro | € | | | | 312.695 | 179.661 | 57% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -39.742 | -15.732 | |
| Totaal via ILG | | | | | 272.953 | 163.929 | |

| Zuid Holland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------|------|----------------|------------------------|-------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.726 | 1.887 | 109% | 63.023 | 108.092 | 172% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 855 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 7 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 2.781 | 622 | 22% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 250 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 8.264 | 1.362 | 16% | 56.480 | 27.984 | 50% |
| Beheer | HA | 22.014 | 17.874 | 81% | 80.389 | 44.917 | 56% |
| Veenweidegebied | HA | 21.660 | 42.431 | 196% | 2.036 | 4.068 | 200% |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 2 | 0 | | 5.200 | 2.609 | 50% |
| Totaal Euro | € | | | | 207.128 | 187.670 | 91% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 3.525 | 0 | 0% | 14.320 | 7.043 | 49% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 5 | 71% | 1.102 | 329 | 30% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 3.982 | 5.518 | 139% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 1 | 0 | 0% | 1.200 | 289 | 24% |
| Totaal Euro | € | | | | 16.622 | 7.661 | 46% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 9.585 | 2.464 | 26% | 4.330 | 11.079 | 256% |
| Overig landbouw | HA | 200 | 0 | 0% | 20.730 | 8.884 | 43% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 1 | 0 | 0% | 830 | 350 | 42% |
| Totaal Euro | € | | | | 25.890 | 20.313 | 78% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 2.082 | 1.120 | 54% | 177.960 | 84.946 | 48% |
| Ruilen Rods | HA | 2.094 | 482 | 23% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 616 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 69 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 814 | 0 | 0% | 17.700 | 7.873 | 44% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 2.072 | 579 | 28% | 50.979 | 10.866 | 21% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 63 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 2.475 | 6.287 | 254% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 16.000 | 5.290 | 33% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 17 | 2 | 12% | 3.790 | 758 | 20% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 218 | 295 | 136% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 266.429 | 109.733 | 41% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 204 | 219 | 107% | 1.110 | 2.525 | 227% |
| Inrichten | KM | 84 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 306 | 396 | 129% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 0 | 2.489 | |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | 2.159 | 1.448 | 67% |
| Overig landschap | OPP | 3 | 3 | 100% | 7.600 | 4.726 | 62% |
| Totaal Euro | € | | | | 10.869 | 11.188 | 103% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 6 | 1 | 17% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 263 | 58% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 9 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 15.154 | 1.896 | 13% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 11 | 0 | 0% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 129.896 | 80.794 | 62% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 139 | 17% |
| Totaal Euro | € | | | | 673.271 | 419.657 | 62% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -27.361 | -23.824 | |
| Totaal via ILG | | | | | 645.910 | 395.833 | |

| Noord Holland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|------|----------------|----------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie | | BO | Realisatie | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Vererving | HA | 1.458 | 661 | 45% | 37.849 | 38262 | 101% |
| Vererving EHS ruilgrond | HA | 0 | 239 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 101 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.467 | 92 | 6% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 210 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 3.540 | 2.462 | 70% | 22.260 | 9.393 | 42% |
| Beheer | HA | 23.812 | 20.508 | 86% | 83.033 | 49.678 | 60% |
| Veenweidegebied | HA | 9.606 | 16.684 | 174% | 903 | 0 | 0% |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 2 | 0 | 0% | 590 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 144.634 | 97.333 | 67% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 22.665 | 72 | 0% | 26.240 | 4.913 | 19% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 14 | 6 | 29% | 3.208 | 2.156 | 67% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 0 | 0% | 1.389 | 144 | 10% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 4.284 | 5.918 | 138% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 3 | 0 | 0% | 270 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 31.107 | 7.213 | 23% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 9.369 | 2.236 | 24% | 4.530 | 6.239 | 138% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 2.600 | 0 | 0% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 0 | 1 | | 830 | 626 | 75% |
| Totaal Euro | € | | | | 7.960 | 6.865 | 86% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 1.099 | 435 | 40% | 94.020 | 41.078 | 44% |
| Ruilen Rods | HA | 1.190 | 432 | 36% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 532 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 28 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 500 | 0 | 0% | 25.900 | 0 | 0% |
| Inrichten | HA | 725 | 446 | 62% | 9.300 | 1.247 | 13% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 1.364 | 127 | 9% | 25.228 | 4.026 | 16% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 14 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 5.952 | 17.855 | 300% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 1.000 | 100 | 10% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 18 | 6 | 33% | 4.037 | 1.715 | 42% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 266 | 122 | 46% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 159.485 | 48.166 | 30% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 25 | 1 | 4% | 1.290 | 244 | 19% |
| Inrichten | KM | 49 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 276 | 20.998 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 11.698 | 2.088 | 68% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | | 1.824 | |
| Overig landschap | OPP | 4 | 0 | 0% | | 3.990 | |
| Totaal Euro | € | | | | 12.988 | 8.146 | 63% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 1 | 1 | 100% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 25 | 6% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 9 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 13.734 | 124 | 1% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 4 | 0 | 0% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 65.280 | 6.803 | 10% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 552 | 66% |
| Totaal Euro | € | | | | 436.472 | 175.227 | 40% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -33.701 | -18.840 | |
| Totaal via ILG | | | | | 402.771 | 156.387 | |

| Limburg | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------|------|----------------|------------------------|-------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.988 | 1.880 | 95% | 63.017 | 90.747 | 144% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 1.302 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 683 | | 0 | 259 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 440 | 69 | 16% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 523 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 3.995 | 1.372 | 34% | 65.180 | 22.122 | 34% |
| Beheer | HA | 23.797 | 21.152 | 89% | 76.696 | 41.730 | 54% |
| Veenweidegebied | HA | 11.000 | 13.603 | 124% | 4.200 | 0 | 0% |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 3 | 0 | 0% | 14.400 | 158 | 1% |
| Totaal Euro | € | | | | 223.493 | 155.016 | 69% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 20.119 | 0 | 0% | 23.240 | 3.822 | 16% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 21 | 15 | 71% | 4.229 | 2.612 | 62% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 1 | 14% | 1.753 | 2.622 | 150% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 4.140 | 2.657 | 64% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 8 | 24 | 300% | 950 | 751 | 79% |
| Totaal Euro | € | | | | 30.172 | 9.807 | 33% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 6.300 | 1.137 | 18% | 10.960 | 6.800 | 62% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 0 | 0 | | 830 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 11.790 | 6.800 | 58% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 4 | 3 | 75% | 1.261 | -326 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 32 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 14.458 | 16.382 | 113% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 10 | 4 | 40% | 1.746 | 343 | 20% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 143 | 10 | 7% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 3.007 | 17 | 1% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 200 | 205 | 103% | 6.200 | 18.256 | 294% |
| Inrichten | KM | 620 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 202 | 1.855 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 8.309 | 0 | 40% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | | 2.724 | |
| Overig landschap | OPP | 1 | 0 | 0% | | 624 | |
| Totaal Euro | € | | | | 14.509 | 21.604 | 149% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 5 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 129 | 29% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 5 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 6.916 | 946 | 14% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 7.012 | 352 | 5% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 615 | 45 | 7% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 75.280 | 55.150 | 73% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 443 | 53% |
| Totaal Euro | € | | | | 366.451 | 249.912 | 68% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -41.375 | -13.839 | |
| Totaal via ILG | | | | | 325.076 | 236.073 | |

| Noord Brabant | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------|------|----------------|------------------------|-------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| Vererving | HA | 2.853 | 2.765 | 97% | 96.943 | 136.608 | 141% |
| Vererving EHS ruilgrond | HA | 0 | 1.112 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 758 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.648 | 299 | 18% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 1.652 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 9.904 | 3.029 | 31% | 56.100 | 14.337 | 26% |
| Beheer | HA | 52.074 | 53.412 | 103% | 85.065 | 42.195 | 50% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 1.027 | 52 | 5% | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 4 | 0 | 0% | 16.570 | 161 | 1% |
| Totaal Euro | € | | | | 254.678 | 193.301 | 77% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 14.063 | 0 | 0% | 44.420 | 10.540 | 24% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 21 | 158 | 71% | 5.778 | 3.790 | 66% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 9 | 129% | 1.389 | 1.106 | 80% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 9.451 | 4.699 | 50% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 4 | 2 | 50% | 2.460 | 211 | 9% |
| Totaal Euro | € | | | | 54.047 | 15.647 | 29% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 17.463 | 4.237 | 24% | 14.250 | 21.320 | 150% |
| Overig landbouw | HA | 250 | 6 | 2% | 9.070 | 2.735 | 30% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 4 | 1 | 25% | 830 | 128 | 15% |
| Totaal Euro | € | | | | 24.150 | 24.183 | 100% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 7 | 36 | | 1.292 | 954 | 74% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 91 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 26.389 | 32.502 | 123% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 18 | 6 | 33% | 4.175 | 874 | 21% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 254 | 11 | 4% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.467 | 1.828 | 33% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 748 | 203 | 27% | 6.330 | 7.021 | 111% |
| Inrichten | KM | 331 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 403 | 1.671 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 5.040 | 2.177 | 59% |
| Overig landschap | AANT | 2 | 0 | 0% | | 1.509 | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | 0% | | -706 | |
| Totaal Euro | € | | | | 11.370 | 10.001 | 88% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 5 | 3 | 60% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 293 | 65% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 11 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 16.321 | 4.578 | 28% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 6.499 | 0 | 0% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 267 | 0 | 0% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 70 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 86.860 | 55.642 | 64% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 833 | 100% |
| Totaal Euro | € | | | | 454.177 | 306.306 | 67% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -71.571 | -42.538 | |
| Totaal via ILG | | | | | 382.606 | 263.768 | |

| Zeeland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------|------|----------------|------------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie T/m 2011 | | BO | Realisatie T/m 2011 | |
| | | PE | PE | % | x € 1.000 | x € 1.000 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 792 | 727 | 92% | 13.131 | 26.997 | 205% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 83 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 32 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 820 | 206 | 25% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 292 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 2.124 | 582 | 27% | 16.100 | 6.383 | 40% |
| Beheer | HA | 12.179 | 10.918 | 90% | 31.988 | 19.099 | 60% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 2 | 2 | 100% | 230 | 196 | 85% |
| Totaal Euro | € | | | | 61.449 | 52.675 | 86% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 2.657 | 290 | 11% | 8.640 | 2.336 | 27% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 7 | 5 | 71% | 1.630 | 967 | 59% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 4 | 57% | 1.282 | 244 | 19% |
| Westerschelde | HA | 600 | 385 | 64% | 138.050 | 40.044 | 29% |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 2.224 | 2.762 | 124% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 2 | 4 | 200% | 310 | 205 | 66% |
| Totaal Euro | € | | | | 149.912 | 43.796 | 29% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 9.018 | 5.064 | 56% | 5.150 | 2.927 | 57% |
| Overig landbouw | HA | 250 | 260 | 104% | 9.070 | 6.806 | 75% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 5 | 2 | 40% | 830 | 20 | 2% |
| Totaal Euro | € | | | | 15.050 | 9.753 | 65% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 17 | 8 | 47% | 359 | -34 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 15 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 707 | 8.074 | | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 5 | 4 | 80% | 1.280 | 240 | 19% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 127 | 49 | 39% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 1.639 | 206 | 13% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 501 | 387 | 77% | 1.770 | 1.318 | 74% |
| Inrichten | KM | 56 | 0 | 0% | | | |
| Beheer | HA | 51 | 195 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 5.446 | 372 | 73% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | | 865 | |
| Overig landschap | OPP | 1 | 0 | 0% | | 2.756 | |
| Totaal Euro | € | | | | 7.216 | 5.311 | 74% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 9 | 5 | 56% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 68 | 15% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 5 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.398 | 725 | 13% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 0 | |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 1 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 100 | 12% |
| Totaal Euro | € | | | | 241.947 | 112.634 | 47% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -12.473 | -18.220 | |
| Totaal via ILG | | | | | 229.474 | 94.414 | |

| Flevoland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|-------|----------------|---------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO | Realisatie | | BO | Realisatie | |
| | | PE | T/m 2011 | % | x € 1.000 | T/m 2011 | % |
| 1 Natuur EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.172 | 762 | 65% | 49.385 | 47.385 | 96% |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 123 | | 0 | 0 | |
| Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 3 | 89 | 2967% | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 695 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 670 | 513 | 77% | 8.240 | 2.456 | 30% |
| Beheer | HA | 5.988 | 6.513 | 109% | 20.082 | 8.520 | 42% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Totaal Euro | € | | | | 77.707 | 58.361 | 75% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 1.500 | 0 | 0% | 5.680 | 2.883 | 51% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 6 | 86% | 1.282 | 281 | 22% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS | HA | 1.008 | 2.557 | | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Totaal Euro | € | | | | 6.962 | 3.164 | 45% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 7.960 | 1.379 | 17% | 2.990 | 80 | 3% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 2 | 0 | 0% | 830 | 240 | 29% |
| Totaal Euro | € | | | | 3.820 | 320 | 8% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting (lop. Verpl.) | HA | 0 | 0 | | 1.560 | 2.416 | 155% |
| Inrichting (lop. Verpl.) | KM | 0 | 0 | | | | |
| Beheer | HA | 2.738 | 7.537 | | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 1 | 0 | 0% | 2.707 | 268 | 10% |
| Landelijke routenetwerken | HA/KM | 195 | 64 | 33% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 4.267 | 2.684 | 63% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 520 | 0 | 0% |
| Inrichten | KM | 0 | 0 | | | | |
| Beheer | HA | 2 | 8.871 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 1.292 | 0 | 71% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | | 923 | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | | | 0 | |
| Totaal Euro | € | | | | 1.812 | 923 | 51% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 2 | 3 | 150% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 300 | 115 | 38% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 4 | 52 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 4.459 | 848 | 19% |
| 7 Aandachtsgebieden | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 0 | |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken leefbaarheid | AANT | 0 | 4 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 306 | 37% |
| Totaal Euro | € | | | | 100.160 | 66.721 | 67% |
| Financiering PNB/POP BBL | | | | | -15.598 | -11.370 | |
| Totaal via ILG | | | | | 84.562 | 55.351 | |
