

VWS Programma Trekkingsrecht PGB

EERSTE DEELRAPPORTAGE CONTRA-
EXPERTISE OP PLAN TECHNISCHE
VERSTEVIING



Sparrenhevel 32, 3708 JE Zeist | (030) 2 270 500 | info@mxi.nl | www.mxi.nl

Project 115026
Versie 1.4 (definitief)
22 april 2015

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
1.1	Situatieschets	4
1.2	Vraagstelling	4
1.3	Doelstelling	5
1.4	Status	5
1.5	Leeswijzer	5
2	ONDERZOEKSOPZET	6
2.1	Gevolgde aanpak	6
2.2	Eerste deelrapportage – vraagstelling	7
2.3	Eerste deelrapportage – afbakening	7
3	BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN	8
3.1	Robuustheid (onderzoeksvraag 1.1)	8
3.2	Schaalbaarheid (onderzoeksvraag 1.2)	9
3.3	Flexibiliteit (onderzoeksvraag 1.3)	10
4	CONCLUSIES	11
4.1	Voldoende basis voor de toekomst?	11
4.2	Maatregelen die op korte termijn noodzakelijk zijn	11
5	UITGEVOERDE ANALYSES	13
5.1	Algemene indruk van het huidige PGB-landschap	13
5.1.1	Inzicht verkrijgen in het huidige PGB-systeemlandschap	13
5.1.2	Kwalificatie van het huidige PGB-systeemlandschap	13
5.2	Robuustheid (onderzoeksvraag 1.1)	14
5.2.1	Betekenis van het begrip ‘robustheid’	14
5.2.2	Gestelde eisen aan de robuustheid van het systeemlandschap	14
5.2.3	Basis voor ons expertoordeel	14
5.2.4	Expertoordeel – robuustheid van de SSP-systemen	14
5.2.5	Expertoordeel – robuustheid van de portalen	15
5.2.6	Expertoordeel – robuustheid van de batchverwerkingen	15
5.3	Schaalbaarheid (onderzoeksvraag 1.2)	16
5.3.1	Betekenis van het begrip ‘schaalbaarheid’	16
5.3.2	Gestelde eisen aan de schaalbaarheid van het systeemlandschap	16
5.3.3	Basis voor ons expertoordeel	17
5.3.4	Expertoordeel – schaalbaarheid van de SSP-systemen	17
5.3.5	Expertoordeel – schaalbaarheid van de portalen	17
5.3.6	Expertoordeel – schaalbaarheid van de batchverwerking	18
5.4	Flexibiliteit (onderzoeksvraag 1.3)	18
5.4.1	Betekenis van het begrip ‘flexibiliteit’	18
5.4.2	Gestelde eisen aan de flexibiliteit van het systeemlandschap	18

5.4.3	Basis voor ons expertoordeel	19
5.4.4	Expertoordeel – flexibiliteit in algemene zin	19
5.4.5	Expertoordeel – flexibiliteit in de context van specifieke wijzigingen	19
Bijlage 1	Verwerking nalevering	21



1 INLEIDING

M&I/Partners voert in opdracht van Programma Trekkingsrecht PGB van VWS een contra-expertise uit op het verstevigingsplan van het PGB-systeemlandschap bij SVB. In deze eerste deelrapportage beperken we ons tot de vraag of het huidige systeemlandschap een goede basis is voor de toekomst.

1.1 SITUATIESCHETS

De SVB heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om het informatiesysteem voor de uitvoering van het nieuwe trekkingsrecht PGB te realiseren en te beheren. De SVB voerde al de oude regeling van het PGB (loonadministratie voor de AWBZ) uit. In het kader van die opdracht heeft de SVB bestaande webportalen aangepast en een nieuw portaal ontwikkeld. Ook is het gebruikte backofficesysteem (Nestor) overgezet naar een nieuw technisch platform (de applicatie heet nu Treks). In 2015 zal de SVB nieuwe functionaliteiten realiseren. Verder is er een plan gemaakt voor de technische versteviging van het systeemlandschap.

1.2 VRAAGSTELLING

Het programma Trekkingsrecht PGB van het ministerie van VWS heeft M&I/Partners gevraagd om een contra-expertise uit te voeren op dit verstevigingsplan. De contra-expertise moet antwoord geven op de volgende vier onderzoeksvragen:

- 1 Is het huidige systeemlandschap een goede basis voor de toekomst qua robuustheid, schaalbaarheid en flexibiliteit?
- 2 Zijn de voorgestelde technische verstevigingen noodzakelijk en effectief?

- 3 Voldoet de doelarchitectuur, zoals beoogd in het verstevigingsplan, aan de vigerende architectuurkaders?
- 4 Zijn de kosten van de versteviging onderbouwd en terecht?

Op basis van de antwoorden wordt M&I/Partners gevraagd of het landschap verder vernieuwd/verstevigd moet worden of dat zelfs nieuwbouw aan de orde is. Hiernaast heeft VWS aan M&I/Partners verzocht om alternatieven te adviseren waar dat mogelijk en nodig is.

1.3 DOELSTELLING

Dit document is een *eerste deelrapportage* van de contra-expertise. VWS heeft M&I/Partners verzocht om tussentijds een antwoord te formuleren op de eerste onderzoeksvraag, gericht op het huidige systeemlandschap. De reden hiervoor is dat er vragen zijn gesteld door de Tweede Kamer die raken aan deze onderzoeksvraag en die eerder beantwoord moeten worden dan de beoogde opleverdatum van de contra-expertise. De resterende vragen worden in een tweede deelrapportage en een integraal eindverslag beantwoord.

1.4 STATUS

Het voorliggende document betreft een definitieve eerste deelrapportage, waarin het reviewcommentaar van VWS en SVB is verwerkt. De rapportage is gebaseerd op een behoorlijk volledig feitenbeeld; alleen rond de DBS-pakketten (financiële applicaties) heeft M&I/Partners (te) weinig informatie gekregen.

Na het definitief maken van deze eerste deelrapportage heeft M&I/Partners van SVB aanvullend materiaal ontvangen over het huidige systeemlandschap. Dit naar aanleiding van de review van SVB op de conceptversie van de eerste deelrapportage. Bijlage 1 – Verwerking nalevering beschrijft de aard van de aanvullend ontvangen informatie en de impact op de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag.

1.5 LEESWIJZER

De opbouw van dit document is als volgt.

- In hoofdstuk 2 beschrijven de onderzoeksoepzet, zoals hij bij de uitvoering van de contra-expertise is gehanteerd.
- In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen beantwoord middels een expertoordeel.
- In hoofdstuk 4 formuleren we onze conclusies.
- Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van de analyses die we hebben uitgevoerd op het huidige PGB-systeemlandschap.

2 ONDERZOEKSOPZET

In dit hoofdstuk geven we aan hoe de contra-expertise is opgezet en uitgevoerd.

2.1 GEVOLGDE AANPAK

De aanpak die is gevolgd tijdens de contra-expertise is gebaseerd op ISO25040, zie onderstaande figuur.



In het document ‘procesbeschrijving’ zijn de afzonderlijk stappen (in de vorm van gesprekken, interviews, sessies) en het materiaal (zoals documenten) waarop de contra-expertise is gebaseerd nader uitgewerkt. De aanpak bestaat uit de volgende fasen:

Week 1 en 2 - vaststellen onderzoeksopzet

In een eerste fase zijn de onderzoeksvragen uitgewerkt en afgestemd met VWS (zie het document ‘onderzoeksopzet’). Dit heeft geleid tot een lijst met ongeveer 35 onderzoeksvragen die de vier hoofdvragen nader detailleren. In een gezamenlijke kick off met VWS en SVB zijn afspraken gemaakt over te interviewen personen, beschikbaar te stellen documentatie en over terugkoppelen en reviewmomenten. Expliciet is afgesproken géén gespreksverslagen te maken of te werken met vooropgezette vragenlijsten.

Week 2 t/m 4 - opstellen feitenbeeld

In deze fase zijn er ongeveer 15 interviews gehouden met betrokkenen bij SVB (zie het document ‘procesbeschrijving’). Daarnaast zijn er ongeveer 70 documenten en overzichten bestudeerd om observaties te staven op feitelijke juistheid. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport (zie het document ‘bevindingenrapportage’), waarbij de bevindingen bij de afgesproken onderzoeksvragen zijn genoteerd. Halverwege deze fase kwam het verzoek van VWS tot een eerste deelrapportage. Gevolg hiervan is dat het feitenbeeld bij het schrijven van dit rapport nog incompleet was.

Week 4 – waardering, expertbeoordeling (beperkt tot eerste deelrapportage)

Op basis van het (onvolledige) feitenbeeld heeft M&I/Partners zich een oordeel gevormd over onderzoeksvraag 1: de vraag of het huidige systeemlandschap een goede basis voor de toekomst biedt. Ons expertoordeel hierover wordt in deze eerste deelrapportage geformuleerd.

Week 4 – opstellen conclusies en advies (beperkt tot eerste deelrapportage)

M&I/Partners formuleert conclusies en een advies ten aanzien van de technische kwaliteit van het huidige landschap. In dit rapport beperken we ons tot conclusies ten aanzien van het huidige systeemlandschap.

In de weken hierna is de eerste deelrapportage gereviseerd door alle betrokkenen en is het commentaar verwerkt.

2.2 EERSTE DEELRAPPORTAGE – VRAAGSTELLING

Deze eerste deelrapportage richt zich op de technische kwaliteit van het huidige systeemlandschap op een drietal aspectgebieden: robuustheid, schaalbaarheid en flexibiliteit. In overleg met opdrachtgever VWS zijn de volgende onderzoeksvragen vastgesteld:

- 1 Is het huidige systeemlandschap een goede basis voor de toekomst?
 - 1.1 Robuustheid: is het huidige systeemlandschap voldoende robuust om zonder grote verstoringen te kunnen functioneren?
 - 1.2 Schaalbaar: kan met het huidige systeemlandschap de verwachte groei worden ondervangen?
 - 1.3 Flexibiliteit: is het huidige systeemlandschap voldoende flexibel om de voorziene wijzigingen te kunnen realiseren?

Bij de beoordeling is het systeemlandschap verdeeld in:

- SSP-systemen. Dit zijn de systemen waarmee SSP dagelijks werkt. Dit omvat Nestor, Treks, documentmanagementsysteem en het financieel systeem DBS;
- Portalen. Dit zijn de systemen waarmee de ketenpartners zoals budgethouders, gemeenten en zorgkantoren werken;
- Batchverwerking. Dit zijn de batchprocedures die bijvoorbeeld zorgdragen voor de synchronisatie van gegevens tussen de verschillende systemen.

In het document 'onderzoeksopzet' en in de bevindingenrapportage zijn deze onderzoeksvragen nog een slag dieper uitgewerkt.

2.3 EERSTE DEELRAPPORTAGE – AFBAKENING

De contra-expertise heeft een bredere scope dan het huidige systeemlandschap. De contra-expertise richt zich ook op het verstevigingsplan, de beoogde doelarchitectuur en de kosten van het plan. Daarover wordt later separaat gerapporteerd.

Hiernaast is het van belang te benadrukken dat M&I/Partners geen onderzoek heeft gedaan naar de *functionele kwaliteit* van het systeemlandschap. M&I/Partners constateert dat betrokkenen uit de uitvoering (veel) mogelijkheden zien om het werkproces te optimaliseren, bijvoorbeeld door het beperken van de hoeveelheid handwerk en het wegnemen van de noodzaak tot overtikken en ander dubbel werk. Dit alles valt buiten de scope van het onderzoek van M&I/Partners en is niet meegenomen in het oordeel.

Ook ten aanzien van de technische kwaliteit van het landschap formuleert M&I/Partners geen alomvattend oordeel: kwaliteitsaspecten zoals beveiligbaarheid, interoperabiliteit en de kwaliteit van de broncode van individuele systemen vallen buiten de scope van ons onderzoek. De eerste deelrapportage richt zich alleen op de robuustheid, schaalbaarheid en flexibiliteit van het huidige PGB-systeemlandschap.

3 BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN

In dit hoofdstuk beantwoorden we de drie sub- onderzoeksvragen zoals gesteld in sectie 2.2. De hoofdvraag wordt in het volgende hoofdstuk beantwoord.

3.1 ROBUUSTHEID (ONDERZOEKSVRAAG 1.1)

De te beantwoorden onderzoeksvraag is: is het huidige systeemlandschap voldoende robuust om zonder grote verstoringen te kunnen functioneren?

Ons antwoord op deze vraag is dat twee van de drie onderdelen uit het PGB-landschap niet voldoende robuust zijn: de SSP-systemen en de batchverwerking. Alleen de portalen zijn naar het oordeel van M&I/Partners voldoende robuust. Zie de samenvatting van ons oordeel in onderstaande tabel (gehanteerde normering: onvoldoende, twijfelachtig, voldoende):

Onderdelen	Robuustheid	Opmerkingen
SSP-systemen	Twijfelachtig	Er zijn diverse verstoringen geweest in de maanden januari, februari en maart. Dit ligt niet aan de nieuw ontwikkelde Treks-software, die draait na aanvankelijke kinderziektes relatief probleemloos. De oorzaak van de verstoringen ligt voor een groot deel in de infrastructuur (onderliggende hardware, systeemsoftware, opslag, netwerken etc.) en de invloed van de batchverwerkingen op de SSP-systemen. Ook zijn er diverse constructies aangetroffen die de kans op verstoringen verhogen. Het risico voor de SSP-operatie is relatief hoog.
Portalen	Voldoende	Er is een beperkt aantal constructies aangetroffen die de kans op verstoringen verhogen; maar de daadwerkelijke beschikbaarheid lijkt op dit moment in orde. In ons oordeel wegen we mee dat de externe zichtbaarheid en impact van verstoringen in een portaal hoog is.
Batchverwerking	Onvoldoende	De fouttolerantie is beperkt, niet alle batchverwerkingen kunnen omgaan met uitval van een record en problemen in individuele verwerkingen werken door in het samenstel aan batchverwerkingen. Dit leidt in de praktijk tot verstoringen. De impact is hoog door het ernstige effect op de andere deelsystemen (portalen en SSP-systemen).

Hierbij maakt M&I/Partners de volgende kanttekeningen:

- Doordat er geen eisen zijn gesteld aan de robuustheid van het PGB-systeemcomplex kunnen we geen objectief antwoord geven op de onderzoeksvraag.
- Doordat er alleen fragmentarische informatie beschikbaar is over de daadwerkelijke robuustheid (geen stress-/duurtesten, bevindingenoverzichten bevatten weinig informatie over verstoringen, monitoringresultaten zijn grotendeels beperkt tot de portalen) heeft M&I/Partners zich deels moeten baseren op interviews;

- De voorspelbaarheid van robuustheid is beperkt door het ontbreken van voldoende testfaciliteiten (regressietest, representatieve testomgeving¹). Het effect van wijzigingen in het landschap op het gedrag is niet goed voorspelbaar.

3.2 SCHAALBAARHEID (ONDERZOEKSVRAAG 1.2)

De te beantwoorden onderzoeksvraag is: kan met het huidige systeemlandschap de verwachte groei worden ondervangen?

Ons antwoord op deze vraag is dat twee van de drie onderdelen uit het PGB-landschap de verwachte groei kunnen ondervangen: de SSP-systemen en de portalen. De batchverwerking is naar ons oordeel onvoldoende schaalbaar. Zie onderstaande samenvatting:

Onderdelen	Schaalbaarheid	Opmerkingen
SSP-systemen	Voldoende	De huidige prestaties zijn voldoende. Er wordt een beperkte groei verwacht in de belasting. Er is onzekerheid ten aanzien van de groei van de dossiers (gegevensopslag en DMS) en de impact daarvan op de prestaties.
Portalen	Voldoende	Ook hier zijn de huidige prestaties voldoende terwijl er een beperkte groei wordt verwacht. Doordat de performance continu wordt gemonitord kan SVB bij eventuele problemen proactief reageren.
Batchverwerking	Onvoldoende	Hoewel de doorlooptijd van de export-batch sterk is teruggebracht (van 9 naar 3 uur) is er een aantal andere batchverwerkingen dat buiten de beschikbare doorlooptijd (nacht en/of weekend) loopt. Zonder adequate maatregelen zullen de maximale doorlooptijden in de toekomst naar onze verwachting nog toenemen.

Hierbij maken we de volgende kanttekeningen:

- De eisen die zijn gesteld en praktijknormen die worden gehanteerd door SVB ten aanzien van performance, doorlooptijden en schaalbaarheid zijn op onderdelen aanwezig, maar onvolledig. Een objectief antwoord op de onderzoeksvraag kunnen we dus niet geven.
- Ons oordeel is gebaseerd op de beschikbare kentallen ten aanzien van de verwachte groei in de belasting van het landschap. M&I/Partners heeft geen doorvertaling aangetroffen naar kentallen voor de verwachte groei in dossiervorming (gegevensopslag en batchverwerkingen).
- Door gebrek aan performance/stresstesten en monitoring-faciliteiten hebben we ons deels op interviews moeten baseren. Hieruit komt geen eensluidend beeld naar voren, met name ten aanzien van de doorlooptijden van de batches. SVB is wel begonnen met het treffen van maatregelen op dit vlak.

¹ Sinds medio februari is een tijdelijke representatieve testomgeving ingericht, in afwachting van de structurele omgeving.

3.3 FLEXIBILITEIT (ONDERZOEKSVRAAG 1.3)

De te beantwoorden onderzoeksvraag is: is het huidige systeemlandschap voldoende flexibel om de voorziene wijzigingen te kunnen realiseren?

Ons antwoord op deze vraag is dat het huidige systeemlandschap in algemene zin beperkt flexibel is. De flexibiliteit ten aanzien van specifiek voorziene wijzigingen is niet goed te bepalen omdat veel van de geuite wensen onvoldoende concreet zijn. Er zijn wensen die potentieel veel impact hebben. Zie onderstaande samenvatting:

Onderdeel	Flexibiliteit	Opmerkingen
Wijzigbaarheid in algemene zin	Twijfelachtig	Er zijn diverse constructies in het systeemlandschap ontstaan die de wijzigbaarheid in algemene zin beperken. Het systeemlandschap is historisch gegroeid en niet onder architectuur ontwikkeld. Functionaliteit zit soms op meerdere plaatsen en er is een nauwe koppeling tussen Treks en de DBS-pakketten, waardoor wijzigingen in de één direct gevolgen hebben voor de ander. Het is niet goed voorspelbaar wat de impact van wijzigingen is op het totale landschap (risico van zij-effecten bij wijzigingen). Daarnaast is er een aanzienlijke technische schuld: Nestor is nog niet uitgefaseerd, er is beperkte unittestdekking ² , er is onvoldoende architectuur- en ontwerpdocumentatie. SVB heeft beperkt controle op tempo en tijdstip van doorvoeren van de gewenste wijzigingen aan de pakketten DBS T&S en DBS Fin van Visma Software en het daarin door Visma gerealiseerde maatwerk.
Geschiktheid voor voorziene wijzigingen	Geen oordeel	Er is een aantal wensen uit de keten (pre-CAB) die potentieel veel impact lijken te hebben op het huidige landschap. Voorbeelden: overlappende toekenningsbeschikkingen en het volledig doorvoeren van meerdere beschikkingen per wet.

Hierbij maken we de volgende kanttekeningen:

- Veel van de geuite wensen en eisen zijn onvoldoende concreet. Het was en is daarmee onduidelijk op welke punten het systeem flexibel moe(s)t zijn. Flexibiliteit moet altijd worden beschouwd in de context van de voorziene wijzigingen. We hebben ook een aantal eisen van de ketenpartijen aangetroffen ten aanzien van variëteit die naar onze indruk grote impact hebben, erg risicovol zijn en wellicht overbodig zijn (in hun algemene formulering); hier moet nog eens goed naar gekeken worden.
- We hebben geen uitgewerkte impactanalyses aangetroffen voor de geuite wensen en eisen.
- Er zijn alleen principes opgesteld ten aanzien van flexibiliteit in algemene en abstracte zin. Er is geen concretisering van deze principes voor het huidige systeemlandschap en de eisen en wensen daaraan.

² Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de dekking van de unittests. De functionele testdekking (systeem-, keten- en regressietestset) is reeds conform de gemaakte risico-inschatting voor de gerealiseerde of aangepaste functionaliteit.

4 CONCLUSIES

De te beantwoorden hoofd-onderzoeksvraag is: is het huidige systeemlandschap een goede basis voor de toekomst?

4.1 VOLDOENDE BASIS VOOR DE TOEKOMST?

De conclusie van M&I/Partners is dat het huidige landschap nog geen voldoende basis is voor de toekomst. Met name de batchverwerkingen (robustheid, schaalbaarheid) en de SSP-systemen (robustheid) scoren op sommige onderzochte punten lager dan een voldoende. De flexibiliteit van het totale landschap is daarnaast twijfelachtig.

Hierbij moet worden aangemerkt dat de in 2014 nieuw ontwikkelde software (Treks en portalen) wel degelijk een voldoende scoren op de onderzochte kwaliteitsaspecten. De lagere scores zijn veeleer een gevolg van de complexe samenhang van deze nieuwe onderdelen met de andere onderdelen in het landschap.

We hechten er aan om te benadrukken dat de huidige problematiek in het PGB-proces niet gekwalificeerd mag worden als een technisch ICT-probleem. Er is in onze ogen veeleer sprake van een ketenprobleem (afstemming diverse partijen). Ook de functionele problematiek (die we niet hebben onderzocht) lijkt veel groter te zijn dan de technische problematiek ten aanzien van robustheid die wij constateren in het huidige landschap. In essentie draait het huidige landschap naar behoren. Er zijn incidenten maar die leiden niet tot grote verstoringen van het proces. Ons oordeel ten aanzien van onvoldoende technische kwaliteit moet veeleer gezien worden in het licht van toekomstige wensen en eisen. Het landschap is niet klaar voor de toekomst.

Ook willen we aanmerken dat veel geconstateerde problemen een gevolg zijn van de grote haast waarmee het PGB-landschap in 2014 is ontwikkeld. Hierbij zijn (terecht) korte-termijn oplossingen gekozen die vanuit architectuur-oogpunt niet optimaal zijn voor de toekomst. De observatie dat er in januari 2015 überhaupt een draaiend systeemlandschap was zien wij als een prestatie van belang. SVB heeft onderkend dat de huidige situatie niet optimaal is en denkt vanuit die optiek na over – en werkt aan – oplossingen. Of deze oplossingen adequaat de geconstateerde problemen ondervangen moet nader onderzocht worden.

We tekenen hiernaast aan dat er naar ons oordeel onvoldoende inzicht is in de toekomst van het landschap, zowel qua functionaliteit als qua groei in de gegevensopslag. Zodra er meer inzicht is in de toekomst (rond de zomer, als het verbeterplan beschikbaar is) zou deze vraag nogmaals gesteld moeten worden. M&I/Partners concludeert dat het wel noodzakelijk is om het landschap verder te verstevigen, zie hierna.

4.2 MAATREGELEN DIE OP KORTE TERMIJN NOODZAKELIJK ZIJN

Op basis van onze analyses adviseren we om op korte termijn de volgende maatregelen te nemen. Merk op dat we bij dit advies nog geen oordeel hebben over de door SVB voorgestelde verstevigingen in het verstevigingsplan. Dit volgt in een later rapport.

- Voorspelbaarheid. Verbeter de testaanpak (testdekking unittests, automatisering van systeem- en regressietest, uitvoeren van performance-, load- en stresstest), de monitoring (performance/

beschikbaarheid in productie) en de registratie (incidentenregistraties). Hiermee neem de huidige onzekerheid af;

- Technische schuld. Het landschap is bijvoorbeeld onvoldoende gedocumenteerd, bevat een systeem (Nestor) dat uitgefaseerd moet worden³ en er is een lage (unit)testdekking. Deze technische schuld is bewust genomen om de deadline van 1 januari te halen. Op termijn is het niet inlossen van de schuld een belangrijke blokkade voor de doorontwikkeling. We adviseren er nu mee te beginnen;
- Robuustheid infrastructuur. We adviseren een gedegen afweging te maken tussen de gewenste beschikbaarheid van het systeemlandschap en acceptabele risico's daarbij enerzijds en de (hoge) kosten van mogelijke aanvullende maatregelen om bijvoorbeeld de infrastructuur redundant uit te voeren anderzijds;
- Batchverwerking. Die scoort op alle onderzochte eigenschappen een onvoldoende. We adviseren de fouttolerantie van individuele batchverwerkingen en van het samenstel aan batchverwerkingen als geheel nader te onderzoeken en verbeteren;
- SSP-systemen. De robuustheid van de SSP-systemen moet worden verbeterd door een aantal kwetsbaarheden nader te analyseren: de virtualisatie-infrastructuur voor medewerkers buiten Utrecht, de (negatieve) gevolgen van uitlopende batchverwerkingen en de invloed van onderhoudswerkzaamheden (met name bij DBS);
- Portalen. Hoewel de portalen voldoende scores adviseren we om de fouttolerantie ten aanzien van uitlopende batchverwerkingen te verhogen. Dit om het risico van negatieve publiciteit te verminderen.

Op een aantal van de genoemde terreinen is SVB al begonnen met het treffen van maatregelen. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit onze voorstellen afdoende afdekt.

³ Uitfaseren van Nestor is opgenomen in de sprintplanning. Het is M&I/Partners onbekend of er voldoende zicht is op nut of noodzaak van de nu door Nestor gerealiseerde restfunctionaliteit.

5 UITGEVOERDE ANALYSES

In de rest van dit document vatten we de resultaten samen van de analyses die M&I/Partners heeft uitgevoerd. Nadat we een algemene indruk gegeven van het huidige PGB-systeemlandschap (sectie 5.1) formuleren we ons expertoordeel ten aanzien van robuustheid (5.2), schaalbaarheid (5.3) en flexibiliteit (5.4). Deze analyses zijn gebaseerd op de gedetailleerde bevindingen die in de bevindingenrapportage zijn opgenomen.

5.1 ALGEMENE INDRUK VAN HET HUIDIGE PGB-LANDSCHAP

In deze sectie geven we eerst onze algemene indruk van het huidige systeemlandschap.


5.1.1 Inzicht verkrijgen in het huidige PGB-systeemlandschap

We hebben uitstekende medewerking gekregen van SVB bij de uitvoering van ons onderzoek. Medewerkers waren snel beschikbaar voor interviews en waren ook zeer open in hun antwoorden. Ook opgevraagde documentatie kwam over het algemeen snel in ons bezit. Alleen ten aanzien van de DSB-applicaties hebben we bij het ter perse gaan van deze eerste deelrapportage onvoldoende informatie kunnen verkrijgen en wordt in het review commentaar veelvuldig verwezen naar documentatie die niet (ondanks herhaald verzoek) ter beschikking is gesteld. SVB is wederom gevraagd deze rapportages te leveren.

Ondanks deze goede medewerking heeft het relatief lang geduurd voordat M&I/Partners inzicht kreeg in het huidige systeemlandschap. We hebben geen documenten of visualisaties aangetroffen die de actuele situatie adequaat weergeven. Het oordeel van M&I/Partners is dat het huidige systeemlandschap onvoldoende gedocumenteerd is en dat kennis erover verspreid is binnen de SVB-organisatie (en in de hoofden zit van medewerkers). Er is alleen fragmentarische projectdocumentatie beschikbaar, maar geen samengestelde systeemdocumentatie (architectuur- en ontwerpdocumentatie). Dit heeft niet alleen ons onderzoek bemoeilijkt, maar zorgt er ook voor dat het onderhouden en beheren van het systeemlandschap moeilijker is dan noodzakelijk.

5.1.2 Kwalificatie van het huidige PGB-systeemlandschap

Onze interpretatie van het systeemlandschap is weergegeven in nevenstaande figuur.

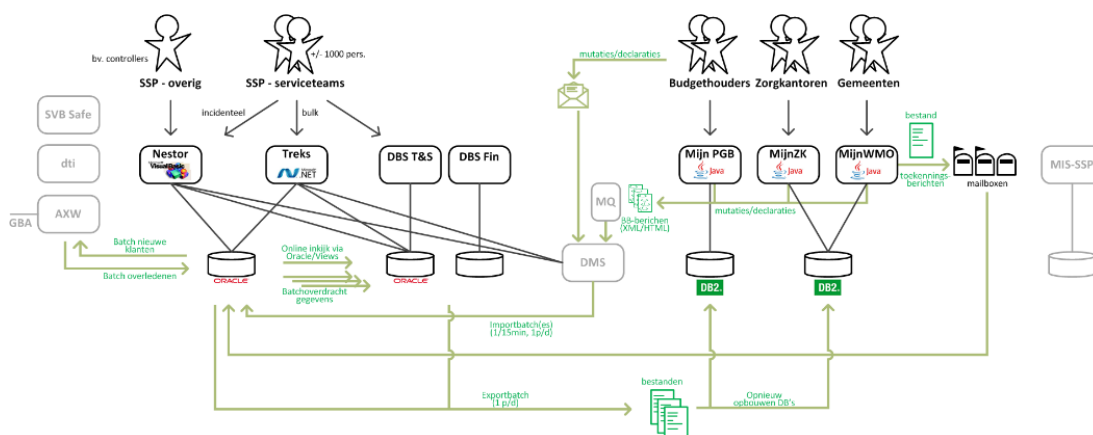

M&I/Partners ziet de volgende kenmerkende eigenschappen van het systeemlandschap:

- gegevens worden vastgelegd in de SSP-systemen;
- de gegevens worden 's nachts met batchverwerking vanuit de SSP-systemen naar de gegevensopslag bij de portalen overgezet. De gegevensstructuur van deze opslag verschilt met die in de SSP-systemen;
- er is een aanzienlijke technische schuld: documentatie is niet op orde, testdekking van de geautomatiseerde unittests loopt achter, er is duplicatie (zowel in batches als in portaal), Nestor-delen zijn nog actief.

5.2 ROBUUSTHEID (ONDERZOEKSVRAAG 1.1)

Te beantwoorden onderzoeksvraag: is het huidige systeemlandschap voldoende robuust om zonder grote verstoringen te kunnen functioneren?

5.2.1 Betekenis van het begrip 'robuustheid'

Robuustheid is een vaag en veelomvattend begrip. M&I/Partners maakt gebruik van ISO25010 om dit begrip te definiëren. Binnen ISO25010 wordt robuustheid (betrouwbaarheid) gedefinieerd als 'de mate waarin een systeem, product of component gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde condities gedurende een gespecificeerde hoeveelheid tijd'. Dit begrip wordt door ISO25010 onderverdeeld in drie eigenschappen die we hebben onderzocht:

Eigenschap	Definitie
Maturity (Volwassenheid)	De mate waarin een systeem, product of component aan betrouwbaarheidsbehoeften voldoet onder normale werkomstandigheden
Fault tolerance (Fouttolerantie)	De mate waarin een systeem, product of component werkt zoals bedoeld ondanks de aanwezigheid van hard- of softwarefouten
Availability (Beschikbaarheid)	De mate waarin een systeem, product of component operationeel en toegankelijk is wanneer men het wil gebruiken

5.2.2 Gestelde eisen aan de robuustheid van het systeemlandschap

M&I/Partners heeft geen concrete eisen aangetroffen ten aanzien van bovenstaande eigenschappen. Noch in requirements-documenten of SLA-afspraken, noch in architectuurkaders zijn hier eisen aan gesteld. We kunnen dus geen objectief antwoord geven op de vraag of het systeemlandschap 'voldoende robuust' is.

5.2.3 Basis voor ons expertoordeel

We hebben relatief weinig feitelijk materiaal aangetroffen om ons oordeel op te baseren. Er zijn fragmentarische overzichten en analyses aangetroffen van daadwerkelijke verstoringen en beschikbaarheidsmetingen. Ook ontbreken er geautomatiseerde hulpmiddelen voor het uitvoeren van systeem- en regressietesten (er zijn wel gedocumenteerde, herhaalbare functionele testscripts aangetroffen die handmatig worden uitgevoerd) en zijn er geen geautomatiseerde hulpmiddelen en een representatieve testomgeving voor het uitvoeren van stress- en loadtesten. Bij het formuleren van ons oordeel hebben we ons gebaseerd op deze fragmentarisch beschikbare waarnemingen aangevuld met gedane observaties tijdens de interviews.

5.2.4 Expertoordeel – robuustheid van de SSP-systemen

De onderzoeksvraag hebben we apart beschouwd voor de portalen, de batchverwerkingen en de systemen voor SSP-medewerkers. In deze sectie beschouwen we de robuustheid van de systemen voor SSP-medewerkers (Treks, Nestor, DBS T&S, DBS Fin).

- de SSP-medewerkers percipiëren de robuustheid van de applicatie Treks zelf als voldoende; na diverse kinderziektes in januari is er een dalende trend ingezet in problemen;
- de SSP-systemen zijn kwetsbaar voor problemen in de infrastructuur, wat in de maanden februari en maart geleid heeft tot diverse verstoringen. Ook onderhoudswerkzaamheden en doorlopende batchverwerkingen hebben enkele keren geleid tot verminderde prestaties geleid;
- de structuur van het landschap (duplicatie in bijvoorbeeld code en controlefunctionaliteit, afhankelijkheid Treks van DBS T&S) en de inrichting van het ontwikkel-/ releaseproces (veel handmatige acties bij releases van de DBS-pakketten) zijn op een paar plaatsen foutgevoelig. Dit heeft voornamelijk niet geleid tot daadwerkelijke verstoringen in productie;
- applicaties en servercomponenten zijn over het algemeen niet redundant uitgevoerd. Bij grootschalige verstoringen is herstel van de dienstverlening dus afhankelijk van herstel van de falende component of van overschakelen naar uitwijkvoorzieningen (kan tot 48 uur duren). Tijdelijk (nieuwe hardware is reeds geleverd) is geen uitwijkvoorziening beschikbaar voor de Treks/Nestor en DBS databases – deze hardware wordt ingezet als aanvullende capaciteit van de productieomgeving.

Hiermee beoordelen we de robuustheid van de SSP-systemen als twijfelachtig. Er zijn diverse daadwerkelijke verstoringen geweest in de maanden februari en maart en er zijn diverse constructies aangetroffen die de kans op het optreden van verstoringen verhogen. Het risico voor de SSP-operatie is relatief hoog.

5.2.5 Expertoordeel – robuustheid van de portalen

Hier beschouwen we de robuustheid van de portalen (MijnPGB, MijnWMO, MijnZK).

- de beschikbaarheid van MijnPGB en MijnZK ligt in de laatste 5 weken op 99% en 97%. De initiële problemen in januari zijn verholpen door het bijschakelen van hardware en het optimaliseren van de gegevenstoegang. Voor MijnWMO zijn er geen cijfers;
- als er batchverwerkingen falen bestaat de kans dat de portalen geen actuele informatie hebben. Dat kan ook informatie betreffen over bijvoorbeeld de status van overeenkomsten: gemeenten zien op het portaal een reeds geaccordeerde overeenkomsten nog steeds als niet-geaccordeerd. Dit is een voorbeeld van gebrek aan fouttolerantie;
- de structuur van het systeemlandschap (duplicatie) is op een paar plaatsen foutgevoelig. Dit heeft voornamelijk niet geleid tot daadwerkelijke verstoringen in productie;
- de infrastructuur voor de portalen is niet redundant uitgevoerd. Bij grootschalige verstoringen is herstel van de dienstverlening dus afhankelijk van herstel van de falende component of van overschakelen naar uitwijkvoorzieningen (kan tot 48 uur duren).

Hiermee beoordelen we de portalen als voldoende robuust. Er is een beperkt aantal constructies aangetroffen die de kans op verstoringen verhogen; maar de daadwerkelijke beschikbaarheid lijkt op dit moment in orde. In ons oordeel wegen we mee dat impact en externe zichtbaarheid hoog is bij van verstoringen in een portaal.

5.2.6 Expertoordeel – robuustheid van de batchverwerkingen

Hier beschouwen we de robuustheid van de batchverwerkingen.

- de batchverwerkingen falen enkele keren per maand. De impact hiervan is hoog: Treks biedt verminderde prestaties en er kan verouderde/ misleidende informatie op de portalen worden getoond;

- de fouttolerantie van de batchverwerkingen is beperkt. Niet alle batchverwerkingen kunnen omgaan met een verwerkingsfout in één record (bijvoorbeeld één budgethouder), wat kan leiden tot uitval van de gehele batch. Door de onderlinge volgordelijkheid van batchverwerkingen en de doorlooptijd ervan kan één fout snel leiden tot verwerkingen die langer duren dan de beschikbare doorlooptijd (nacht en/of weekend) en/of (in het geval van de exportbatch) het niet actualiseren van de gegevens in de portalen;
- de structuur van het systeemlandschap (duplicatie) is op een paar plaatsen foutgevoelig. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot daadwerkelijke verstoringen in productie.

Hiermee beoordelen we de batchverwerkingen als onvoldoende robuust. De fouttolerantie is onvoldoende; dit leidt ook in de praktijk tot verstoringen van de SSP-systemen en verouderde informatie op de portalen.

5.3 SCHAALBAARHEID (ONDERZOEKSVRAAG 1.2)

Te beantwoorden onderzoeksvraag: kan met het huidige systeemlandschap de verwachte groei worden ondervangen?

5.3.1 Betekenis van het begrip 'schaalbaarheid'

Binnen ISO25010 is het begrip schaalbaarheid niet expliciet opgenomen; schaalbaarheid wordt hier meestal uitgedrukt in termen van de eigenschap 'prestatie efficiency'. Dit begrip wordt onderverdeeld in de volgende eigenschappen:

Eigenschap	Definitie
Time behaviour (snelheid)	De mate waarin antwoord- en verwerkingstijden en doorvoersnelheid van een product of systeem, tijdens de uitvoer van zijn functies, voldoet aan de wensen.
Resource utilization (middelenbeslag)	De mate waarin de hoeveelheid en type middelen die gebruikt worden door een product of systeem, tijdens de uitvoer van zijn functies, voldoet aan de wensen.

5.3.2 Gestelde eisen aan de schaalbaarheid van het systeemlandschap

M&I/Partners heeft geen expliciete eisen aangetroffen ten aanzien van snelheid en middelenbeslag. Alleen voor Treks is gesteld dat de response tijden minimaal hetzelfde moeten zijn als bij Nestor. Daarnaast wordt voor het monitoren van de responsetijden van de portalen in de praktijk gewerkt met een gemiddelde responsetijd van 1,5 seconde. Uitgaande van een keten van vier transacties voor MijnZK, geeft dat een maximum van 6 seconden. De doorlooptijd van de batches is beperkt door het maximale window van 12 uur (10 uur bij overwerk) dat 's-nachts beschikbaar is.

Er zijn wel duidelijke kentallen beschikbaar voor de verwachte groei in de belasting van het systeemlandschap. Daaruit blijkt dat er geen groei meer wordt verwacht in het aantal budgethouders en een beperkte groei in het aantal declaraties/facturen en zorgovereenkomsten dat verwerkt moet worden. Er wordt een daling verwacht in het aantal SSP-medewerkers en in het aantal vragen van budgethouders. Onduidelijk is of er nog speciale piekmomenten te verwachten zijn rond incidentele werkzaamheden, zoals misschien een jaarafsluiting. Ten aanzien van de groei van de omvang van de dossiers (en gevolgen voor de gegevensopslag en batchverwerking) zijn geen kentallen beschikbaar.

5.3.3 Basis voor ons expertoordeel

We hebben relatief weinig feitelijk materiaal aangetroffen om ons oordeel op te baseren. Stress- en loadtesten worden niet structureel en/of geautomatiseerd uitgevoerd; er loopt wel een proof-of-concept naar tooling hiervoor. Alleen voor de doorlooptijd van de export-batch zijn simulaties uitgevoerd. Van de portalen zijn performance-metingen in productie beschikbaar; van de SSP-systemen en de batches niet of beperkt. Wel hebben we email-discussies van opgetreden incidenten beschikbaar. Bij het formuleren van ons oordeel hebben we ons gebaseerd op deze beperkte waarnemingen aangevuld met gedane observaties tijdens de interviews.

5.3.4 Expertoordeel – schaalbaarheid van de SSP-systemen

Eerst beschouwen we de performance en schaalbaarheid van de systemen voor SSP-medewerkers.

- huidige snelheid: er zijn weinig klachten over de responsetijden van de SSP-systemen, met uitzondering van de momenten waarop batchverwerkingen uitlopen. Er zijn geen waarnemingen uit monitoring beschikbaar⁴. Hier doen we de aanname dat de performance afdoende is;
- verwachte snelheid na groei: de responsetijden van de SSP-systemen blijven naar onze verwachting op orde; er wordt nauwelijks groei verwacht (eerder een daling in de belasting). Hierin zit een onzekerheid ten aanzien van de verwachte groei van de gegevensopslag, die is onbekend;
- voorspelbaarheid: SVB heeft geen maatregelen getroffen (stress testen, monitoring in productie) om problemen te voorspellen of proactief te kunnen reageren als er performanceproblemen ontstaan.

Hiermee beoordelen we de schaalbaarheid van de SSP-systemen als voldoende, met de opmerking dat er onzekerheid is.

5.3.5 Expertoordeel – schaalbaarheid van de portalen

Hier beschouwen we de schaalbaarheid van de portalen (MijnPGB, MijnWMO, MijnZK).

- huidige snelheid: de huidige responstijden van de portalen liggen (na aanpassing van de server hardware en optimalisatie van de gegevenstoegang) onder de gehanteerde normen van 6 seconden maximaal. Deze praktijknorm is gebaseerd op keten van vier transacties voor MijnZK; uitgaande van een gemiddelde responsetijd van 1,5 seconde voor een transactie geeft dat een maximum van 6 seconden.
- verwachte snelheid na groei: de responsetijden van de portalen blijven naar onze verwachting op orde; er wordt nauwelijks groei verwacht. Hierin zit een onzekerheid ten aanzien van de verwachte groei van de gegevensopslag, die is onbekend;
- voorspelbaarheid: SVB heeft maatregelen getroffen (monitoring in productie) om proactief te kunnen reageren als er performance problemen ontstaan. Er zijn geen maatregelen getroffen (zoals stress- en loadtests) om performance te kunnen voorspellen.

Hiermee beoordelen we de schaalbaarheid van de portalen als voldoende. Met de opmerking dat er onzekerheid is.

⁴ De voor Treks uitgevoerde performancetesten, uitgevoerd voor use cases met ingeschat performancerisico “Hoog”, geven aan dat Treks sneller is dan Nestor. Treks voldoet daarmee aan de door SVB bij gebrek aan concrete eisen gehanteerde praktijknorm.

5.3.6 Expertoordeel – schaalbaarheid van de batchverwerking

Hier beschouwen we de robuustheid van de batchverwerkingen.

- huidige doorlooptijd: in diverse interviews wordt aangegeven dat de doorlooptijd van de exportbatches is teruggebracht van 9 uur tot 3 uur. De verlonings- en boekhoudbatches zijn in de nacht van 11-12 maart ruim uit het beschikbare window van 12 uur (10 uur bij overwerk) gelopen en ook eerder zijn er problemen geweest⁵. We beoordelen de huidige doorlooptijd – zeker van het samenstel aan batchverwerkingen – als onvoldoende;
- verwachte doorlooptijd na groei: uit simulaties van SVB blijkt dat de doorlooptijd van exportbatches na verwachte groei in 2015 rond de 3,5 uur zit. Voor andere batchverwerkingen zijn geen simulaties beschikbaar;
- voorspelbaarheid: hoewel er door SVB getest/gesimuleerd wordt beoordelen we de voorspelbaarheid als onvoldoende; er zijn te grote onzekerheden in de doorlooptijden van de batches.

Hiermee beoordelen we de schaalbaarheid van de batchverwerkingen als onvoldoende. Hoewel er positieve prestaties worden gemeld (van 9 naar 3 uur) moeten we constateren dat het beschikbare window van 12 uur (10 uur bij overwerk) regelmatig niet wordt gehaald. Het is nauwelijks te voorspellen hoe dit in de toekomst zal zijn, maar zonder maatregelen verwachten we extra problemen.

5.4 FLEXIBILITEIT (ONDERZOEKSVRAAG 1.3)

Te beantwoorden onderzoeksvraag: is het huidige systeemlandschap voldoende flexibel om de voorziene wijzigingen te kunnen realiseren?

5.4.1 Betekenis van het begrip ‘flexibiliteit’

Binnen ISO25010 is het begrip flexibiliteit niet expliciet opgenomen; flexibiliteit wordt meestal uitgedrukt in de volgende termen:

Eigenschap	Definitie
Analysability (Analyseerbaarheid)	De mate waarin het mogelijk is om effectief en efficiënt de impact, van een geplande verandering van één of meer onderdelen, op een product of systeem te beoordelen, om afwijkingen en/of foutoorzaken van een product vast te stellen of om onderdelen te identificeren die gewijzigd moeten worden.
Modifiability (Wijzigbaarheid)	De mate waarin een product of systeem effectief en efficiënt gewijzigd kan worden zonder fouten of kwaliteitsvermindering tot gevolg.

5.4.2 Gestelde eisen aan de flexibiliteit van het systeemlandschap

Alleen in het Integraal Ontwerp en Solution Design (de basis voor het verstevigingsplan) staat het begrip flexibiliteit in abstracte termen toegelicht. Daar gaat het over het kunnen configureren van processen en regels, de ‘loose coupling’ van componenten en het éénmalig realiseren van functionaliteit. Verdere eisen hebben we niet aangetroffen.

⁵ Aanpassen van de functionaliteit en performance van de boekhoudbatch is opgenomen in de sprintplanning.

Er bestaat geen absolute maat voor flexibiliteit. Flexibiliteit moet altijd worden beschouwd in het licht van voorziene wijzigingen. M&I/Partners heeft diverse bronnen voor wijzigingen aangetroffen: functionele wijzigingen van de ketenpartners, functionele wijzigingen vanuit de SSP-werkprocessen, een lijst met in te lossen 'technische schuld' en de verstevigingsvoorstellen uit het verstevigingsplan. Er ontbreekt in onze ogen een integraal beeld over deze vier bronnen. Ook zijn de voorziene wijzigingen onvoldoende geconcretiseerd en geprioriteerd. Alleen voor de korte termijn hebben we inzicht verkregen in de prioriteiten die door de pre-CAB (gemeenten, zorgverzekeraars en belangenvereniging PerSaldo) zijn gesteld. Als gevolg hiervan kunnen we geen volledig objectief antwoord geven op de onderzoeksvraag.

5.4.3 Basis voor ons expertoordeel

M&I/Partners heeft geen uitgewerkte, eenduidige impact analyses aangetroffen van de voorziene wijzigingen (voor geen van de vier aangetroffen bronnen, zie vorige pagina). Bij het formuleren van ons expertoordeel hebben we ons vooral gericht op het analyseren van 'bottlenecks' in het systeemlandschap die in algemene zin de analyseerbaarheid en wijzigbaarheid beperken.

5.4.4 Expertoordeel – flexibiliteit in algemene zin

Er zijn diverse constructies die de wijzigbaarheid in algemene zin beperken:

- in de DBS-pakketten is veel maatwerk gerealiseerd door leverancier Visma; SVB heeft hier nauwelijks controle over;
- door de nauwe integratie tussen Treks en DBS zullen wijzigingen vaak op twee plekken impact hebben. Ook als de structuur wordt aangepast van gegevens die zowel in Treks als DBS vastliggen, leidt dat tot wijzigingen op twee plekken;
- de aanwezigheid van Nestor (naast Treks) bemoeilijkt de wijzigbaarheid (maar de functionaliteiten zijn wel complementair aan elkaar);
- technische schuld. Door ontbrekende architectuur- en ontwerpdocumentatie, doublures in functionaliteit en onvoldoende testmogelijkheden is het over het algemeen moeilijk om wijzigingen gecontroleerd door te voeren. Voorbeelden zijn:
 - de code van MijnZK is gekopieerd van MijnWMO. Er heeft nog geen refactoring plaatsgevonden om gelijke code op één plek te realiseren of niet toepasselijke code te verwijderen. Ook moeten nog andere (kleine) wijzigingen doorgevoerd worden, zoals het ombouwen van een klein aantal schermen naar spring web flow, of het overhalen van inline styling vanuit een aantal pagina's naar de centrale locatie van de styling;
 - een deel van de batchverwerkingen maakt voor controles gebruik van de codebase van Treks. Een deel doet dat nog niet, waardoor dezelfde controles op verschillende plekken uitgeprogrammeerd zijn;
 - een beperkte unittestdekking en het ontbreken van geautomatiseerde ondersteuning voor systeem- en regressietest beperken de voorspelbaarheid van de impact van wijzigingen op het totale landschap⁶.

We beoordelen de flexibiliteit van het systeemlandschap in algemene zin als twijfelachtig.

5.4.5 Expertoordeel – flexibiliteit in de context van specifieke wijzigingen

⁶ Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de dekking van de unittests. De functionele testdekking (systeem-, keten- en regressietestset) is reeds conform de gemaakte risico-inschatting voor de gerealiseerde of aangepaste functionaliteit.

Een aantal wijzigingen die de pre-CAB op korte termijn door wil laten voeren heeft mogelijk grote impact: uitgaand berichtenverkeer, omgaan met meerdere beschikkingen per wet, omgaan met overlappende beschikkingen en het kunnen variëren van de geboden proceskeuzes per periode, per wet en per functie.

De flexibiliteit voor dergelijke voorziene wijzigingen is niet goed te bepalen omdat veel van de geuite wensen onvoldoende concreet zijn en/of een gedetailleerde impactanalyse ontbreekt. Het was en is onvoldoende duidelijk op welke punten het systeem flexibel moe(s)t zijn. Flexibiliteit moet altijd worden beschouwd in de context van de voorziene wijzigingen. Het realiseren van generieke informatievoorziening die bestand is tegen wijzigingen in het algemeen is bewezen complex, duur en risicovol.

BIJLAGE 1 VERWERKING NALEVERING

Bij review van de conceptversie van de eerste deelrapportage heeft SVB aangegeven dat aanvullend materiaal beschikbaar is. Dit materiaal is ontvangen ná het definitief maken van de eerste deelrapportage. Deze bijlage beschrijft de aard van de aanvullend ontvangen informatie en geeft aan in hoeverre M&I/Partners de nieuwe informatie aanleiding vindt de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag bij te stellen.

1.1 AARD AANVULLEND ONTVANGEN INFORMATIE

De aanvullend ontvangen informatie bestaat grofweg uit:

- Ontwerpdocumentatie. Naast een al eerder ontvangen document met een (summiere) uitleg over een aantal IT-architectuuraspecten van Treks, heeft M&I/Partners een functioneel ontwerp ontvangen (use case documentatie voor Nestor) en een conceptueel/logisch gegevensmodel.
- Testdocumentatie. M&I/Partners heeft het mastertestplan en detailtestplan performance voor PGB 10 (herbouw Nestor in Treks) ontvangen.
- Incident- en beheerrapportages. M&I/Partners heeft een SLA over 2014 ontvangen, alsmede verschillende aanvullende overzichten van klachten, meldingen en incidenten ten aanzien van het systeemlandschap zoals vastgelegd in Assyst (het gebruikte tool voor incidentregistratie), van doorlooptijden van een tweetal batchverwerkingen, van performancekarakteristieken van de portalen en de gegevensopslag onder Treks en van oplospercentages/-tijden.

1.2 INVLOED OP BEANTWOORDING EERSTE ONDERZOEKSVRAAG

De aanvullend ontvangen ontwerp- en testdocumentatie heeft geen invloed op de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag door M&I/Partners. Naar aanleiding van het van SVB ontvangen reviewcommentaar heeft M&I/Partners enkele bevindingen en observaties in de definitieve versie van de eerste deelrapportage met betrekking tot testen genuanceerd – de aanvullend ontvangen testdocumenten vragen geen verdere aanpassing. De ontvangen use-casedocumenten en logisch gegevensmodel veranderen het oordeel van M&I/Partners dat er onvoldoende architectuur- en ontwerpdocumentatie is niet.

Ook de aanvullend ontvangen incident- en beheerrapportages hebben geen invloed op de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag door M&I/Partners. Uit de verschillende overzichten uit Assyst kan M&I/Partners niet een integraal overzicht verkrijgen over de technische problemen waar – zo blijkt uit meerdere interviews – het systeemlandschap diverse malen hinder van heeft ondervonden. Bijvoorbeeld de gevallen waarbij grote groepen SSP-medewerkers Treks niet of beperkt konden gebruiken laten zich niet (eenvoudig) afleiden uit de registratie⁷ van individuele klachten of incidenten. Dit maakt dat M&I/Partners van oordeel blijft dat alleen fragmentarische informatie beschikbaar is over de daadwerkelijke robuustheid van het systeemlandschap.

⁷ Dit hoeft overigens niet per se aan de registratie zelf te liggen; ook de wijze van (al dan niet) melden van incidenten kan hierop van invloed zijn.
