Bijlage 3 Planning

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
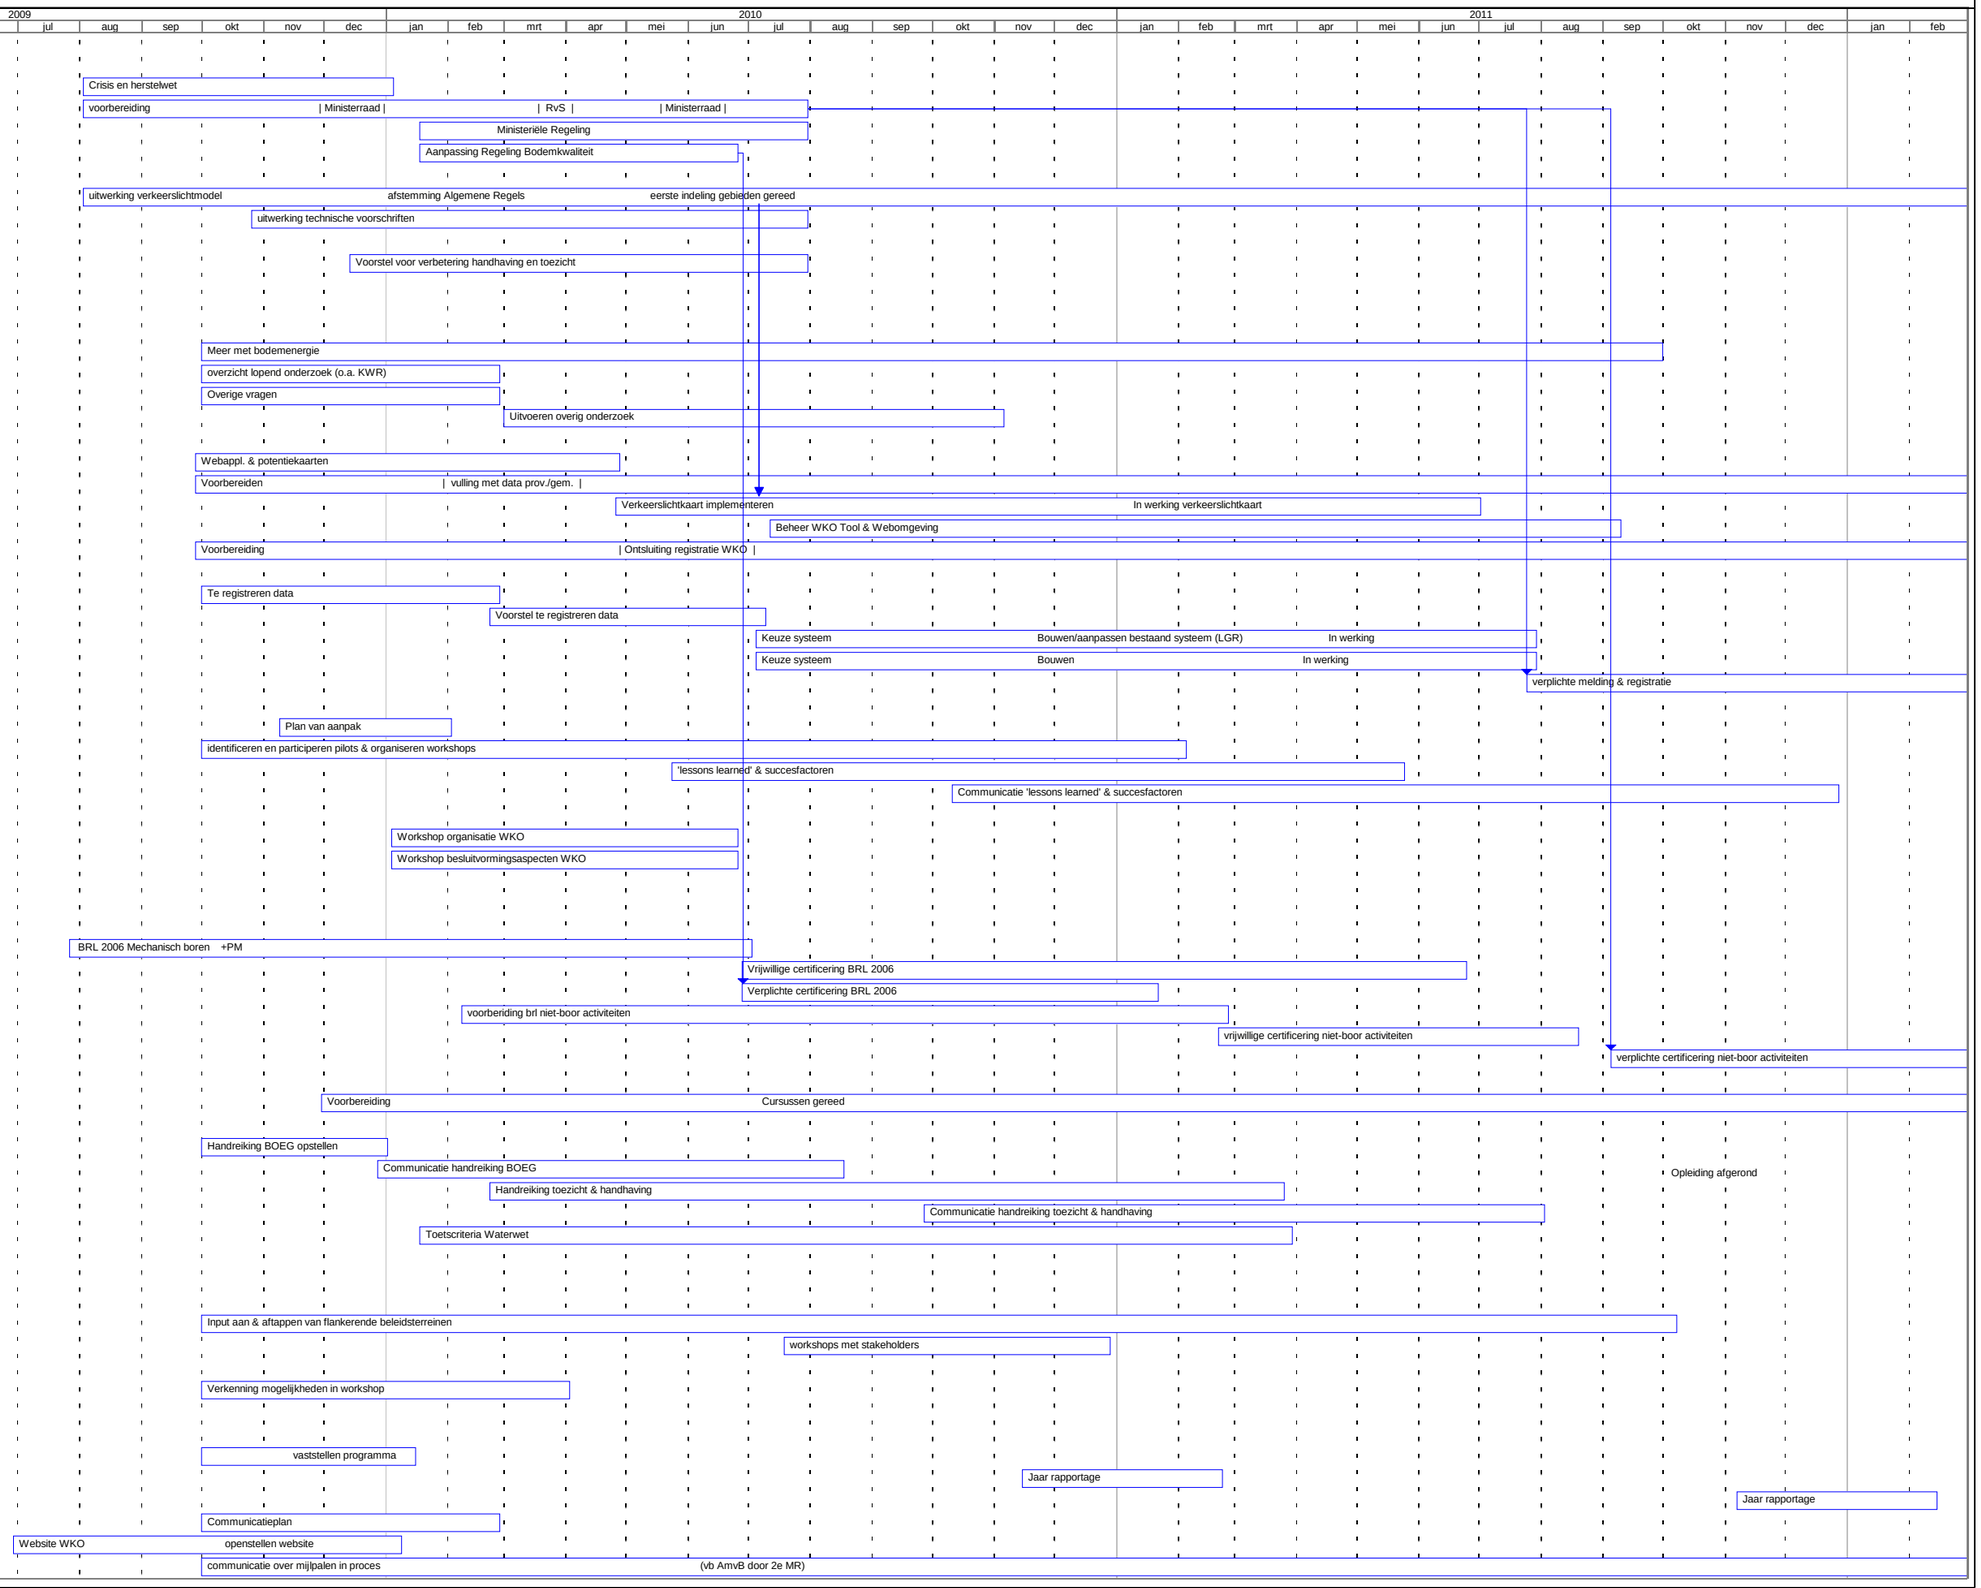
Id	Taaknaam	Start	Einde
1	**SPOOR 1: Beleid en regelgeving WKO**		
2	**ACTIE 1.1 Wet- en regelgeving WKO**		
3	Wettelijke voorziening crisis en herstelwet	Crisis en herstelwet	
4	amvb bodemenergie	voorbereiding | Ministerraad | | RvS | | Ministerraad |	
5	Ministeriële Regeling	Ministeriële Regeling	
6	Aanpassing regeling bodemkwaliteit ivm verplichte certificering boora	Aanpassing Regeling Bodemkwaliteit	
7	**ACTIE 1.2 uitwerking vergunningenbeleid en technische voorschrift**		
8	Uitwerking verkeerslichtmodel	uitwerking verkeerslichtmodel afstemming Algemene Regels eerste indeling gebieden gereed	
9	uitwerking technische voorschriften	uitwerking technische voorschriften	
10	**ACTIE 1.3 Handhaving**		
11	Voorstel voor verbetering handhaving en toezicht	Voorstel voor verbetering handhaving en toezicht	
12			
13	**SPOOR 2: Informatie en kennisoverdracht**		
14	**ACTIE 2.1 Onderzoek WKO**		
15	Meer met bodemenergie	Meer met bodemenergie	
16	Overzicht lopend en uitgevoerd onderzoek (o.a. KWR)	overzicht lopend onderzoek (o.a. KWR)	
17	Ontbrekende onderzoeksvragen	Overige vragen	
18	Uitvoeren overig onderzoek	Uitvoeren overig onderzoek	
19	**ACTIE 2.2 WKO Tool/Verkeerslichtkaart**		
20	Ontwikkelen webapplicatie en potentiekaarten	Webappl. & potentiekaarten	
21	Vullen webomgeving met data	Voorbereiden | vulling met data prov./gem. |	
22	Verkeerslichtkaart	Verkeerslichtkaart implementeren In werking verkeerslichtkaart	
23	Beheer WKO Tool & Webomgeving	Beheer WKO Tool & Webomgeving	
24	Registratie WKO systemen	Voorbereiding | Ontsluiting registratie WKO |	
25	**ACTIE 2.3 Registratie WKO systemen**		
26	Inventariseren welke data geregistreerd gaat worden	Te registreren data	
27	Voorstel voor te registreren data	Voorstel te registreren data	
28	Registratie systeem open WKO	Keuze systeem Bouwen/aanpassen bestaand systeem (LGR) In werking	
29	Registratie systeem gesloten WKO	Keuze systeem Bouwen In werking	
30	inwerkingtreding verplichte melding & registratie	verplichte melding & registratie	
31	**ACTIE 2.4 Pilots en Casussen**		
32	Plan van aanpak	Plan van aanpak	
33	Identificeren en participeren pilotprojecten & organiseren workshops	identificeren en participeren pilots & organiseren workshops	
34	Vaststellen 'lessons learned' & succesfactoren	'lessons learned' & succesfactoren	
35	Communicatie van 'lessons learned' en succesfactoren	Communicatie 'lessons learned' & succesfactoren	
36	**ACTIE 2.5 Organisatie/besluitvormingsaspecten**		
37	Workshop organisatie WKO	Workshop organisatie WKO	
38	Workshop besluitvormingsaspecten WKO	Workshop besluitvormingsaspecten WKO	
39			
40	**SPOOR 3: Kwaliteitsborging**		
41	**ACTIE 3.1 Kwaliteitsborging / Certificering**		
42	BRL 2006 Mechanisch boren	BRL 2006 Mechanisch boren +PM	
43	Vrijwillige certificering BRL 2006	Vrijwillige certificering BRL 2006	
44	Verplichte certificering BRL 2006	Verplichte certificering BRL 2006	
45	BRL voor niet-boor activiteiten	voorberiding brl niet-boor activiteiten	
46	vrijwillige certificering niet-boor activiteiten	vrijwillige certificering niet-boor activiteiten	
47	verplichte certificering niet-boor activiteiten (indien nodig/mogelijk)	verplichte certificering niet-boor activiteiten	
48	**ACTIE 3.2 Opleidingen organiseren**		
49	Opleidingsmodules voor relevante HBO- en WO opleidingen	Voorbereiding Cursussen gereed	
50	**ACTIE 3.3 Modeldocumenten & Handreikingen WKO**		
51	Handreiking BOEG: Bodemsanering & WKO	Handreiking BOEG opstellen	
52	Communicatie handreiking BOEG	Communicatie handreiking BOEG Opleiding afgerond	
53	Handreiking toezicht & handhaving (SIKB)	Handreiking toezicht & handhaving	
54	Communicatie handreiking toezicht & handhaving	Communicatie handreiking toezicht & handhaving	
55	Toetscriteria Waterwet	Toetscriteria Waterwet	
56			
57	**SPOOR 4: Flankerend beleid**		
58	**ACTIE 4.1: Flankerende beleidsterreinen**		
59	Input leveren aan & aftappen van flankerende beleidsterreinen (nade	Input aan & aftappen van flankerende beleidsterreinen	
60	workshops met stakeholders aan de hand van pilots en casussen	workshops met stakeholders	
61	**ACTIE 4.2: Optimalisering financiële randvoorwaarden**		
62	Verkenning mogelijkheden in workshop	Verkenning mogelijkheden in workshop	
63			
64	**Projectmanagement**		
65	Opstellen samenwerkingsprogramma	vaststellen programma	
66	Jaar rapportage 1	Jaar rapportage	
67	Jaar rapportage 2	Jaar rapportage	
68	Communicatieplan	Communicatieplan	
69	Website WKO	Website WKO openstellen website	
70	Communicatie over mijlpalen in proces	communicatie over mijlpalen in proces (vb AmvB door 2e MR)
